



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

MESA 7



INGRESOS MUNICIPALES



SERVICIOS DE URBANISMO



ORDENAMIENTO TERRITORIAL



CATASTRO



PROYECTOS Y PREINVERSIÓN



OBRAS PÚBLICAS



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

INGRESOS MUNICIPALES



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

**SECTOR : ADM
GENERAL**

UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVO GENERAL

RECAUDAR RECURSOS ECONÓMICOS POR TRIBUTARIOS (IMPUESTOS, PATENTES, TASAS) MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, TRIBUTARIOS PARA QUE CON ELLO EL GAMS PUEDA FINANCIAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL (**RECAU. PROG.2019 BS. 88.528.908.-**)



SECTOR : ADM GENERAL

UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL/ DISTRITAL	9.491 trámites administrativos de bienes inmuebles (empadronamientos, modificación de datos técnicos, entre otros.)	9.491 trámites administrativos (procesamientos en el Sistema RUAT de bienes inmuebles). 2.526 Trámites adicionales	100%	Proyección de Recaudación en un Total de Bs. 41,743,577,00 en la gestión 2019, referente al cobro de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles	Total recaudado Bs. 41.653.726,00 de lo programado 2019, referente al cobro de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles
			ADICIONAL 27%		



COBRO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES

TIPOLOGÍA: **MARGINAL**



TIPOLOGÍA: **INTERÉS SOCIAL**



TIPOLOGÍA: **ECONÓMICA**



TIPOLOGÍA: **MUY BUENA**





SECTOR : ADM GENERAL

UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL/ DISTRITAL	6.400 trámites administrativos vehiculares (inscripciones, cambios de radicatoria, de servicio, modificación de datos técnicos entre otros.)	6.187 trámites administrativos atendidos.	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			96,67%	Proyección de Recaudación en un Total de Bs. 28,373,849,00 en la gestión 2019, referente al cobro de Impuestos a la Propiedad de vehículos automotores	Total recaudado Bs. 19.301.991,00 en la gestión 2019, referente al cobro de Impuestos a la Propiedad de vehículos automotores



COBRO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

VEHÍCULOS: PARTICULARES



VEHÍCULOS : PESADOS



VEHÍCULOS : PÚBLICOS



MOTOCICLETAS





SECTOR : ADM GENERAL

UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL/ DISTRITAL	8.905 trámites administrativos de actividades económicas (Empadronamiento de actividades Económicas, renovación, actualización, baja de licencia de funcionamiento, tasas, Servicios de Terminal de Buses, Servicios Mortuorios, alquiler de arbitrios Municipales y otros ingresos).	8.905 trámites administrativos atendidos en el primer semestre. 4.867 tramites adicionales	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			100%	Proyección de Recaudación en un Total de Bs. 18,411,482,00 en la gestión 2019, por Actividades Económicas.	Total recaudado Bs. 16.755.160,56 en la gestión 2019, por Actividades Económicas.
			ADICIONAL		
			56%		



COBRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ACTIVIDADES: **COMERCIALES**



CLAUSURAS: **POR NO PAGO DE IMPUESTOS**





SECTOR : ADM GENERAL UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

RECAUDACION TOTAL PROGRAMADA Y RECAUDADA PARA LA GESTION 2019

TIPO DE TRIBUTO	RECAUDACION PROGRAMADA SEGÚN POA 2019	MONTO TOTAL RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	% ALCANZADO DE EJECUCIÓN
IPBI – IPVA – PATENTES - TASAS	88.528.908,00	77.710.877,56	88,00%

B DIFICULTADES Y/O RAZONES DE DESVIACION

- Diferentes conflictos sociales (bloqueos, marchas, etc.) en Bolivia particularmente en Ciudad de Sacaba los meses de octubre y noviembre afectando significativamente en el cumplimiento del objetivo programado en el Plan Operativo Anual
- Reducido cultura tributaria en los contribuyentes sacabeños.

C ACCIONES CORRECTIVAS / MEJORA(5)

- Difusión masiva de beneficios tributarios (mercados municipales).
- Poner énfasis en promover la cultura tributaria



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

UNIDAD GESTION DE CALIDAD

**SECTOR : ADM
GENERAL**

UNIDAD: DIRECCION DE INGRESOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVO GENERAL

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015 ES INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE**, MEDIANTE PROCESOS DE MEJORA CONTINUA, QUE TIENEN LA FINALIDAD DE CONTROLAR LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE SUS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



SECTOR : ADM GENERAL

UNIDAD: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL/ DISTRITAL	20 Capacitaciones	20 Capacitaciones	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
	13 Procesos Diagnosticados.	13 Procesos Diagnosticados.	98%	REQUISITOS EXIGIDOS CUMPLIDOS PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015	REQUISITOS EXIGIDOS CUMPLIDOS PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN BASE A LA NORMA ISO 9001:2015
	43 Equipos de Computación gestionados para adquisición.	43 Equipos de Computación instalados en DISM.			
Varios Diseños e implementación de procedimientos, manuales y otros	Varios Diseño e implementación de procedimientos, manuales y otros				
	1 Informe de Auditoría Interna.	1 Informe de Auditoría Interna.			
	2 Informes de Auditoría de Certificación.	2 Informes de Auditoría de Certificación.			
	1 Un Certificado ISO 9001:2015				



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

SERVICIOS DE URBANISMO



SECTOR : URBANISMO Y VIVIENDA	UNIDAD: SERVICIOS DE URBANISMO
OBJETIVO GENERAL	Elaborar y aplicar la normativa urbana y territorial, para regular los asentamientos urbanos y el uso del suelo en el 100% de las solicitudes de servicios urbanos.

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	2448 Aprobaciones de Planos de Lote y Construcción en el Municipio de Sacaba	<p>2.538 aprobaciones de lote y construcción, que comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.417 Aprob. de lote de los 1.244 proyectados - 893 Aprob. de construcciones de 744 proyectados - 102 Aprob. con la amnistía ley 077/17 de 403 proyectados. - 85 Aprob. de lote con la ley 129/18 pacata de 42 proyectados - 41 Aprob. de const. con la ley 129/18 pacata de 15 proyectados <p>Incremento de 90 aprobaciones de lote y construcción</p>	100 % ADICIONAL 4 %	2.448 personas del área urbana beneficiadas con la seguridad jurídica para sus viviendas.	2.538 tramites concluidos de aprobaciones de lotes y construcciones, asimismo 2.538 personas del área urbana beneficiadas con la seguridad jurídica de sus inmuebles.



APROBACIÓN PLANO DE LOTE

... PLANO DE REGULARIZACIÓN DE LOTE ...

TEODOSIA CESPEDES AREBALO 12,00
NELVY ORDOÑEZ VELASCO 25,00
JACINTO VICENTE JORDAN 25,00
SUP. TOTAL LOTE = 300,00 M2
Sup. Afectada = 54,00 M2.

COORDENADAS UTM WGS-84 ZONA 18K

ID	X	Y
P1	812166,812	8069840,820
P2	812178,598	8069838,605
P3	812174,294	8069813,969
P4	812162,447	8069816,217

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA DIRECCIÓN DE URBANISMO APROBADO
 R.M. No. 161/2019 - 15/04/2019
 OBSERVACIONES:
 APROBADA 23/12/2019
 TRAMITE No. 567/2019
 CUALQUIER ALTERACION EN LOS PLANOS APROBADOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O LOTE ANULA AUTOMÁTICAMENTE LA MEDIDA

PROPIETARIO (S): JUAN OROSCO CRUZ

RELACION DE SUPERFICIES
 SUP. SEGUN ESCRITURA : 361,00 M2
 SUP. SEGUN MENSURA : 361,00 M2
 SUP. AFECTADA : 54,00 M2
 SUP. DIFERENCIA : 7,00 M2
 SUP. TOTAL UTIL LOTE : 300,00 M2

SELO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
 Registro u Propiedad Intelectual
 15 SEP 2016

CROQUIS DE UBICACION
 ZONA TURCAPOGUE CENTRO
 DEPARTAMENTO: COCHABAMBA
 MUNICIPIO: SACABA
 ZONA: TUSCAPUGUE CENTRO
 DISTRITO: LAVA LAVA
 UBICACION:
 MANZANA:
 LOTE:
 CALLE: INNOMINADA DE 9,00 M

ESC. 1: 250

039

APROBACIÓN PLANO DE CONSTRUCCIÓN

TIPO DE PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

SELO DE URBANISMO
 DIRECCION DE URBANISMO

SELO DE APROBACION
 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
 DIRECCION DE URBANISMO
APROBADO
 R.M. No. 383/2019 - 02/13/2019
 OBSERVACIONES: 0-1
 APROBADA 12/12/2019
 TRAMITE No. 383/2019
 CUALQUIER ALTERACION EN LOS PLANOS APROBADOS DE CONSTRUCCION Y/O LOTE ANULA AUTOMÁTICAMENTE LA MEDIDA

FIRMA Y SELLO DEL ARQUITECTO
 Arquitecto
 Av. Abraham Malacofsky Sanchez

PROPIETARIO (S): JOSE EDUARDO MONTAÑO VILLAZON

RELACION DE SUPERFICIES:

SUPERFICIE DE LOTE (m2)	VALOR
SUPERFICIE PLANTA BAJA (m2)	147,30
SUPERFICIE PLANTA 1° PISO (m2)	191,00
SUPERFICIE PLANTA 2° PISO (m2)	191,20
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL (m2)	529,50

REVALIDACION

ESCALA 1: 100
LAMINA UNICA

FRONTE TOTAL DEL LOTE O LONGITUD DE VERJA (M): 11,71

UBICACION:
 DEPARTAMENTO: COCHABAMBA
 PROVINCIA: CHAFARE
 MUNICIPIO: SACABA
 SUB-ALCALDIA: EL MORRO
 ZONA:
 CÓDIGO CATASTRAL: 0501100037002
 DISTRITO: 1
 MANZANA: 2
 Nº DE LOTE: 2
 SUB-LOTE:
 CALLE:
 UBICACION: BARRIO DE 12,00 M
 R.M. 27/03/08 FECHA 1/05/08

PLANO DE UBICACION

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA DIRECCION DE URBANISMO
 LA PRESENTE APROBACION DETERMINA SOLAMENTE LA SITUACION FISICO TECNICA DEL TERRENO Y/O CONSTRUCCION Y NO ASI EL DERECHO PROPIETARIO SOBRE EL INMUEBLE

FECHA Y VISACION CAS 20 SEP 2019
 Registro u Propiedad Intelectual

FECHA: 20/09/2019

FIRMA Y SELLO JEFE O DIRECTOR

30





NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
DISTRITAL	APROBACIONES DE LOTES Y CONSTRUCCIONES POR DISTRITOS:		% EJECUCION FISICA POR DISTRITO	ESPERADO	ALCANZADO
	DISTRITO 1 627 aprobaciones de lote y construcción	598 aprobaciones	95,37 %	2.448 personas del área urbana beneficiadas con la seguridad jurídica para sus viviendas.	2.538 tramites concluidos de aprobaciones de lotes y construcciones , asimismo 2538 personas del área urbana beneficiadas con la seguridad jurídica de sus inmuebles.
	DISTRITO 2 569 aprobaciones de lote y construcción	508 aprobaciones	89 %		
	DISTRITO 3 274 aprobaciones de lote y construcción	346 aprobaciones (incremento de 72 aprobaciones)	100 % (adicional 23%)		
	DISTRITO 4 535 aprobaciones de lote y construcción	419 aprobaciones	78%		
	DISTRITO 6 230 aprobaciones de lote y construcción	398 aprobaciones	100 % (adicional 1%)		
	DISTRITO 7 213 aprobaciones de lote y construcción	215 aprobaciones (incremento de 2 aprobaciones)	100 % (adicional 1%)		
	DISTRITO LAVA LAVA Distrito de nueva creación	54 aprobaciones de lote y construcción			



A	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	% EJECUCIÓN ALCANZADO	RESULTADO ALCANZADO
---	---------------------	------------------	-----------------------	---------------------

MUNICIPAL

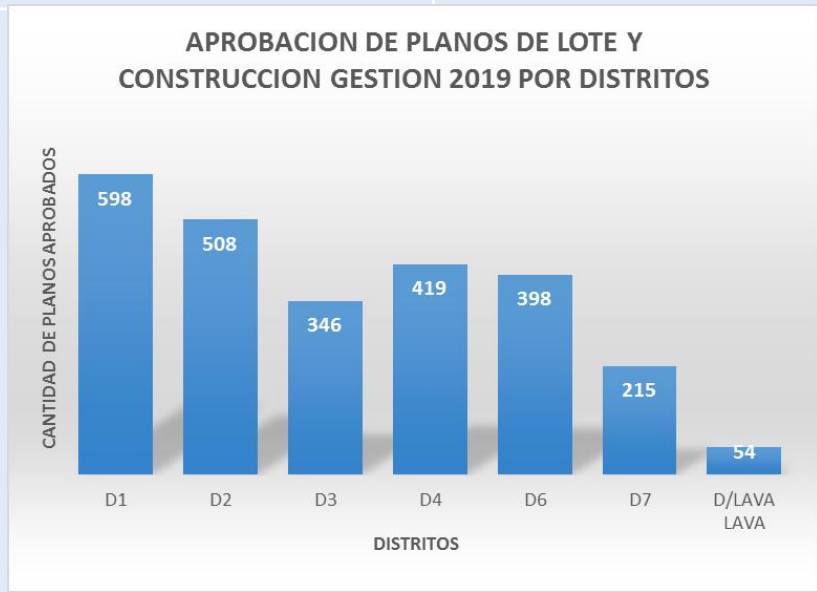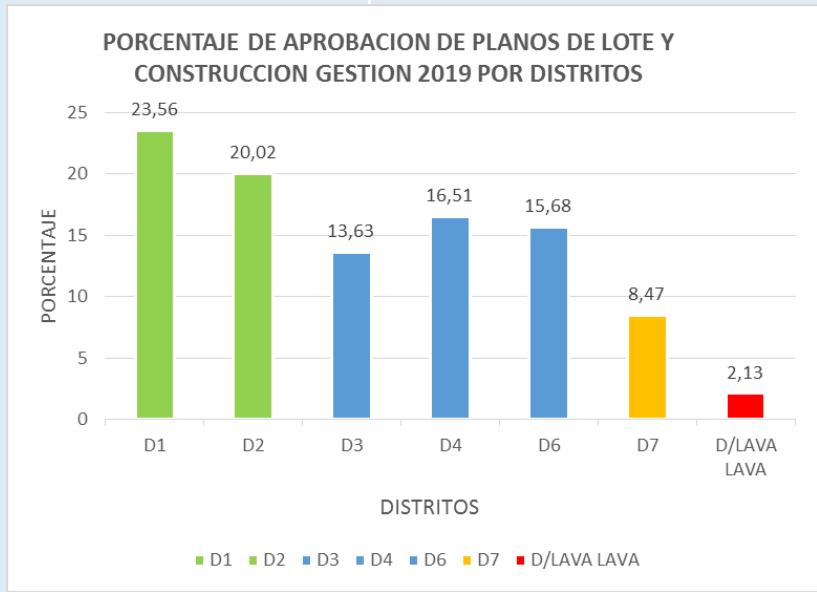



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	261 Certificaciones con la Ley 247 (Reg, derecho Propietario)	38 Certificaciones con la Ley 247 (Reg, derecho Propietario) emitidos.				
DISTRITAL	Certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> D1= 94 D2 = 18 D3= 31 D4= 22 D6= 84 D7= 12 LAVA LAVA= 0 	Certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> D1= 25 D2 = 0 D3= 0 D4= 7 D6= 4 D7= 0 LAVA LAVA= 2 	15%		261 personas con el requisito para la obtención de su derecho propietario.	38 personas con el requisito para la obtención de su derecho propietario. (finalización de Ley 247 en el mes de mayo de esta gestión)

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	814 Certificaciones regulares (Judiciales y Varias)	1.023 Certificaciones regulares (Judiciales y Varias) emitidos				
DISTRITAL	Certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 701 D2 = 34 D3= 20 D4= 31 D6= 10 D7= 18 LAVA LAVA= 0 	Certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> D1= 525 D2 = 56 D3= 0 D4= 137 D6= 282 D7= 10 LAVA LAVA= 13 	100% (adicional 26%)		814 personas atendidas en sus solicitudes de Certificaciones (Judiciales y Varias)	1.023 personas atendidas en sus solicitudes de Certificaciones (Judiciales y Varias)



CERTIFICACIÓN LEY 247

CERTIFICACIONES JUDICIALES Y VARIAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
CERTIFICACION No HMV. 07/2018

Registro N° PROREVI: 452348.

En respuesta al trámite con hoja de ruta N° 13881/2016 - L 38/2016 de **LIZETH FRIDA GAMARRA ADRIAN** con Cedula de Identidad No. 5230528 Cochabamba, respectivamente, donde solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, la regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda, ley 247.

A este efecto en aplicación del Art. 7° num. 2 de la Ley 247 (Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Viviendas) y Art. 9° inc. a) del Decreto Supremo 1314 (Reglamento de la Ley 247), establecen que **para la suscripción de correcciones de datos técnicos, los propietarios, deben presentar a oficinas de Derechos Reales, Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal, que describa los datos de UBICACIÓN, SUPERFICIE Y COLINDANCIAS**.

Es en ese sentido, habiendo presentado el (la) interesado (a), memorial de solicitud, copia de su cedula de identidad, plano georeferenciado donde indica la Superficie y la construcción, certificado de prorevis, soporte magnético en formato SHP. En el Art.4 incisos c), e) y g) de la Ley No. 2341 (Procedimiento Administrativo)

SE CERTIFICA:

Que en el predio de la interesada **Lizeth Frida Gamarra Adrián**, después de revisar las imágenes geoeey del año 2007 - 2013, la inspección técnica en el lote y construcción, se encuentra con lo siguiente:

DATOS TECNICOS:
UBICACION: en la Zona **Central**

SUPERFICIE MENSURA: **158,22 m² según plano**

COLINDANCIAS:

NORTE: Con **Stivia Adrián** (Según plano)

ESTE: Con una **Mario Adrián** (Según plano)

OESTE: Con **Eufronio Vargas** (Según plano)

SUD: Con **Mario Adrián** (Según plano)

Nota: En el predio de **Lizeth Frida Gamarra Adrián** según imagen satelital geoeey del año 2007, **SI EXISTE CONSTRUCCION**, en el lote indicado.

Sacaba, 26 de Diciembre de 2018

- El presente informe NO DETERMINA DERECHO PROPIETARIO sobre el inmueble solamente determina la situación físico técnica realizada, ubicación dada por el interesado y mojones de la propiedad mostradas por el mismo, todo ello dentro la BUENA FE de mismo, si en caso existiera problemas de derecho propietario con el mencionado predio sujeto a certificación el mismo será de entera y total responsabilidad del interesado.

- **CON POSIBLE AFECTACIÓN A LA CONCLUSIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE SACABA; SUJETO A AFECTACIÓN POSTERIOR POR EL PERFIL DE VÍA**, [cuando quiera aprobar su PLANO DE LOTE, este sufrirá afectación por el perfil de vía enmarcado en el Plan Director que se viene aprobando]

Ref: Se adjunta imagen satelital geoeey de fecha 2007
Se adjunta imagen satelital geoeey de fecha 2013

243

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

Dirección de Gestión Urbana y Territorial
Sacaba, 15 de abril de 2019

HR N° 4427/2019 - Certif. HLZ N° 05/2019

A Arq. Edgar Elias Solís Céspedes Director de Gestión Urbana y Territorial
De Lic. Henry Ledezma Zambrana Encargado 1 Asesoría Legal

CERTIFICACIÓN

En atención la Hoja de Ruta N° 4427/19 de fecha 10 de abril de 2019, presentado por el Sr. Lucio Lazo Montaño con C.I. N° 646824 Or., por el que requiere una certificación respecto al trámite APR-101/2016, en ese entendido se tiene a bien certificar lo siguiente:

De la revisión de trámites que se encuentran en la Dirección de Gestión Urbana y Territorial se evidencia la existencia del trámite signado como APR-101/2016 de fecha 01 de noviembre de 2016, referente a la solicitud de aprobación de Plano de Regularización y Subdivisión de Lote "Urbanización CIPRES" incoado por los Sres. Franz Morales Oquendo, María Lourdes Morales Oquendo y Danny Morales Oquendo, sobre el inmueble ubicado en la Zona de Ex - Fundo Tuscapugio, de la extensión superficial de 445.000,00 M2, Parcela N° 4, debidamente registrados bajo Matricula Computanzada N° 3.10.1.01.0032010, Asiento A-3 de fecha 14 de diciembre de 2010. Trámite que a la fecha se encuentra paralizado hasta entre tanto los propietarios subsanen las observaciones técnicas realizadas.

Es cuanto se tiene a bien informar para fines correspondientes.

Atentamente:-

2019.04.15 15:00:00
ERIC J. L. L. LEGAL
ENCARGADO 1 ASERORIA LEGAL
DIRECCION DE GESTION URBANA Y TERRITORIAL DE SACABA

53 MESA 7



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	399 Permisos (Construcción, Demolición y Trabajos Preliminares)	568 Permisos (Construcción, Demolición y Trabajos Preliminares) emitidos	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
DISTRITAL	Permisos: <ul style="list-style-type: none"> D1= 131 D2 = 91 D3= 32 D4= 83 D6= 28 D7= 34 LAVA LAVA= 0 	Permisos: <ul style="list-style-type: none"> D1= 122 D2 = 138 D3= 46 D4= 91 D6= 117 D7= 28 LAVA LAVA= 26 	100% (adicional 42%)	399 personas que obtienes Permisos (Construcción, Demolición y Trabajos Preliminares)	568 personas que obtienes Permisos (Construcción, Demolición y Trabajos Preliminares)

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	2.255 Controles de Construcciones (paralización de obras e inicio de Procesos Administrativos de Demolición)	1.786 Controles de Construcciones (paralización de obras e inicio de Procesos Administrativos de Demolición)	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
DISTRITAL	Control de Construcciones: <ul style="list-style-type: none"> D1= 487 D2 = 67 D3= 227 D4= 397 D6= 753 D7= 324 LAVA LAVA= 0 	Control de Construcciones: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 261 D2 = 275 D3= 108 D4= 293 D6= 441 D7= 203 LAVA LAVA= 205 	79%	1.000 propietarios que inician su proceso de regularización	1.786 notificaciones emitidas a construcciones ilegales.



PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

CONTROLES DE CONSTRUCCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor
Dirección de Gestión Urbana y Territorial

Sacaba, 22 de Octubre de 2019
Inf. HMV- 42/2019 - PC - HR-12708/2019

A: Sr. Humberto Sánchez Sánchez
Vía: Arq. Edgar Elias Solís Céspedes
De: Arq. Héctor Michel Vargas

H. Alcalde Municipal de Sacaba
Director 1 Gestión Urbana y Territorial
Encargado 1 de Urbanismo

Permiso de Construcción - Vivienda

(Basado en el Reglamento General de Urbanización y Subdivisión de Propiedades Urbanas)

1º Antecedentes:
El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba a través de la Dirección de Gestión Urbana y Territorial, concede el **Permiso de Construcción de Vivienda - Comercio (según plano aprobado va construir la PLANTA TIPO 3)** a los Sres. LEONARDO SANCHEZ MEJIA y SRA. El predio ubicado en la Provincia Chapare, Sección Sacaba, Distrito Sacaba (1), Zona Central, Calle Bolívar y Barrientos, cuenta con:

- ✓ Fotocopia simple legalizada del plano aprobado de construcción de Vivienda Comercio con R. M. 473/1996 de fecha 29/07/1996
- ✓ Fotocopia simple legalizada del plano aprobado de lote con R. M. 473/1996 de fecha 29/07/1996
- ✓ Fotocopia simple legalizado del folio real N° de Matricula 3.10.1.01.0009221.
- ✓ Fotocopia simple legalizado del testimonio N° 758/1998
- ✓ Fotocopias simples legalizadas de los pagos de impuesto de los 5 últimos años.

El Permiso de Construcción es para efectuar **los trabajos de construcción de una vivienda comercio (según plano aprobado y la inspección realizada juntamente con la propietaria, va construir la PLANTA TIPO 3)** en el predio de los Sres. LEONARDO SANCHEZ MEJIA y SRA, el predio antes descrito ya que cumple con los requerimientos de la normativa en actual vigencia y cuenta con plano aprobado de vivienda comercio con R.M. 473/96 de fecha 29/07/1996.

Se aclara que todo el material de construcción deberá estar dentro los límites de la propiedad. Se prohíbe el uso de la vía pública que obstruya el libre tránsito vehicular y/o peatonal, caso contrario se someterá a las sanciones correspondientes.

RECOMENDACIONES:

- Los propietarios del inmueble deberán hacerse de modos que no perjudiquen ni ofrezcan peligro alguno a las construcciones de los terrenos colindantes, debiendo tomarse medidas de seguridad para evitar perjuicio o daños a terceros.
- Validez de la autorización.- la autorización tendrá validez durante **6 meses**, siempre que no se hubiere modificado la línea o nivel, pasado este tiempo caducará la misma.
- Respetar el tenor del permiso y no ejecutar trabajos adicionales a la solicitud expresa
- La modificación de los planos sin consentimiento de la dirección de gestión urbana y territorial, como ser obras (ambientes) adicional ajenas al plano de construcción aprobado con Resolución Municipal N° 473/96 de fecha 29/07/1996, se hará pasible a sanciones pecuniarias incluidas la demolición del mismo.

NOTA: El PROPIETARIO presenta una Declaración Jurada para demoler y entrar en RASANTE MUNICIPAL en un plazo de 3 meses.
Es cuanto informo para fines consiguientes del interesado.

Atentamente,

Héctor Michel Vargas
Arq. Héctor Michel Vargas
Encargado 1 de Urbanismo

Edgar Elias Solís Céspedes
Arq. Edgar Elias Solís Céspedes
Director 1 Gestión Urbana y Territorial

Dirección: Pasaje Conatorial 5-002 - Teléfono: N° Píloto 4701677 - 4702330 - 4803059 - Fax Interno: 1043
E-mail: info@sacaba.gob.bo - Página web: www.sacaba.gob.bo
Sacaba - Cochabamba - Bolivia

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

ORDEN DE PARALIZACIÓN DE OBRAS Y CITACIÓN

Form. SAC021
0004450

Señor(a) Maria Beatriz Olmos Herrera

sírvase Ud. paralizar el trabajo de construcción de vivienda comercio que manda a realizar (construir), en su propiedad ubicada en el DISTRITO 1 ZONA El Morro CALLE San Antonio No. 100 de la jurisdicción del Municipio de Sacaba, y presentarse en la Dirección de Urbanismo de Sacaba, ante el Arq. Jefe de la zona administrativa, respectivos, en la fecha: 30 de Agosto del 2019 a horas 08:00

En caso de incumplimiento se hará pasible a la multa pecuniaria de 10000 Bs. de acuerdo a disposiciones legales.

Observaciones: se solicita por favor que se ponga a la par de la obra en su presencia para verificar que se cumpla con lo establecido

En Sacaba, a horas 13:00 del día de hoy 29 de Agosto del 2019

[Firma]
INSPECTOR

Carmen Tinajero
926796-1E
Carmen Tito de Nogales

[Firma]
DIRECTOR DE URBANISMO





NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	2.267 Visaciones de Minutas de bienes inmuebles	2.061 Visaciones de Minutas de bienes inmuebles atendidos	91%		2.267	2.061 Personas beneficiadas con la Visaciones de Minutas y Certificaciones para obtención de su derecho propietario.
DISTRITAL	Visaciones de minutas: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 741 D2 = 486 D3= 134 D4= 597 D6= 185 D7= 124 LAVA LAVA= 0 	Visaciones de minutas: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 366 D2 = 345 D3= 105 D4= 569 D6= 245 D7= 122 LAVA LAVA= 309 			2.267 Personas beneficiadas con la Visaciones de Minutas y Certificaciones para obtención de su derecho propietario.	

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	19.381 Legalizaciones de Planos Aprobados	22.478 Legalizaciones de Planos Aprobados atendidos	100% (adicional 16%)		19.381	22.478 personas beneficiadas con Legalizaciones de Planos Aprobados
DISTRITAL	Legalizaciones de planos aprobados: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 16375 D2 = 1583 D3= 448 D4= 18 D6= 638 D7= 319 LAVA LAVA= 0 	Legalizaciones de planos aprobados: <ul style="list-style-type: none"> D1 = 17950 D2 = 3009 D3= 748 D4= 0 D6= 649 D7= 0 LAVA LAVA= 122 			19.381 personas beneficiadas con Legalizaciones de Planos Aprobados	




NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	1.255 Certificaciones de Datos Técnicos (Ley 247)	1.911 Certificaciones de Datos Técnicos (Ley 247) emitidos	100% (adicional 52%)	1.255 personas beneficiadas con Certificaciones de Datos Técnicos (Ley 247)	1.911 personas beneficiadas con Certificaciones de Datos Técnicos (Ley 247)
DISTRITAL	Certificaciones de datos técnicos: <ul style="list-style-type: none"> D1= 757 D2 = 10 D3= 88 D4= 333 D6= 30 D7= 37 LAVA LAVA= 0 	Certificaciones de datos técnicos: <ul style="list-style-type: none"> D1= 809 D2 = 57 D3= 196 D4= 486 D6= 229 D7= 102 LAVA LAVA= 32 			


NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	4 propuestas de normativas urbanas generadas para el uso y ocupación territorial (proyectos de Ley y Decreto): <ul style="list-style-type: none"> - Modificaciones al Decreto Municipal 004/2.017. - Ley Municipal de Sanciones por incumplimiento a la normativa urbana. - Reglamento General de Urbanizaciones. - Reglamento General de Construcciones. 	3 Propuestas de normativas (proyectos de Ley y Decretos Municipales): <ul style="list-style-type: none"> • Modificaciones al Decreto Municipal 004/2.017. • Ley Municipal de Sanciones por incumplimiento a la normativa urbana. • Ley municipal de utilización de vías publicas, área verde y área de equipamiento. 	75%	4 Instrumentos Normativos aprobados que coadyuvan al Desarrollo y Ordenamiento Territorial mejorando los servicios Urbanos.	3 propuestas de Leyes y decretos que coadyuvaran al Desarrollo y Ordenamiento Territorial mejorando los servicios de Urbanismo.



CERTIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
CERTIFICACION N° 48/2020

Por memorial con hoja de ruta N° 906/2020 de fecha 24 de Enero de 2020, el (la) Sr. (a) **ORLANDO ROBERT ORTIZ GUTIERREZ Y MACIEL JAZMIN CABALLERO ROJAS de ORTIZ**, con cédulas de identidad N° 5270358 y N° 5262845 expedidos en Cochabamba, solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, certificación de los **DATOS TÉCNICOS** de su bien inmueble, el cual se encuentra registrado en oficinas de Derechos Reales, bajo la matrícula computarizada N° 3.10.1.01.0030872; Asiento A-5 de fecha 15 de Enero de 2018.

A este efecto en aplicación del Art. 7° num. 2 de la Ley 247 con las modificaciones y complementaciones de la Ley 803 (Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Viviendas) y Art. 9° inc. b) del Decreto Supremo 2841 (Reglamento de la Ley 247), establecen que *para la suscripción de correcciones de datos técnicos, los propietarios, deben presentar a oficinas de Derechos Reales, Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal, que describa los datos de UBICACIÓN, SUPERFICIE Y COLINDANCIAS*.

Es en ese sentido, habiendo presentado el (la) interesado (a), memorial de solicitud, copia de su cédula de identidad, Folio Real, impuestos de las últimas 5 gestiones y que, revisados los antecedentes técnicos del trámite de **Aprobación con RTA. N° 214/2010 de fecha 19 de Mayo de 2010**, el mismo cuenta con planos aprobados y documentación pertinentes, por lo que bajo los principios establecido en el Art. 4° incisos c), e) y g) de la Ley No. 2341 (Procedimiento Administrativo), **acclarando también que los datos técnicos consignados en la presente certificación están basados en la aprobación del plano de lote, siendo estos los datos válidos para el GAMS**.

SE CERTIFICA:

Que el predio de propiedad de el (la) Sr. (a) **ORLANDO ROBERT ORTIZ GUTIERREZ Y MACIEL JAZMIN CABALLERO ROJAS de ORTIZ**, se encuentra con los siguientes **DATOS TÉCNICOS**

UBICACION: en la **Urbanización "Consortio Maderero" - Zona Tuscapujio - Manzano "S" - Lote N° 10**

SUPERFICIE: 306.63 m².

COLINDANCIAS:

Norte: Con **Lote N° 9**



ESTE: Con **Calle de 9.00 mts.**

OESTE: Con **Lote N° 11**

SUD: Con **Calle de 6.00 mts.**

NOTA: Se aclara también que conforme el carimbo del Plano Aprobado este lleva el denominativo: **"Urbanización Consortio Maderero" Zona: Tuscapujio**

Sacaba, 04 de Febrero de 2020

Dirección: Pasaje Constitucional S-002 - Teléfono: N° Fono 4701677 - 4702301 - 4703058 - Fax Intern: 1043
E-mail: info@sacaba.gob.bo - Página web: www.sacaba.gob.bo
Sacaba - Cochabamba - Bolivia



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



SECTOR : URBANISMO Y
VIVIENDA

UNIDAD: ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO GENERAL

Generar e implementar instrumentos de gestión territorial para la regulación del uso y ocupación del territorio dentro los procedimientos técnicos y administrativos en beneficio de la población de Sacaba.

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	1.600 certificaciones de Área, Superficie, sobre la cota 2750, de uso de suelo, Estructuración Vial, judiciales	1.461 certificaciones de Área, Superficie, sobre la cota 2750, de uso de suelo, Estructuración Vial, judiciales	91%	1.600 personas beneficiadas con Servicios de certificaciones	1.461 certificaciones de Área, Superficie, sobre la cota 2750, de uso de suelo, Estructuración Vial, judiciales
DISTRITAL	D-Ch: 13 D-LL: 479 D-P: 3 D-U: 6 D-3: 65 D-5: 11 D-6: 82 D-7: 97 D-1: 180 D-4: 550 D-2: 114	D-Ch: 13 D-LL: 460 D-P: 3 D-U: 7 D-3: 70 D-5: 6 D-6: 82 D-7: 90 D-1: 130 D-4: 500 D-2: 100			



CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO "ÁREA VERDE"

CERTIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE PREDIO SOBRE COTA 2750

CERTIFICACIÓN DE UBICACIÓN DEL PREDIO

CERTIFICACIÓN DE USO DE SUELO

RECIBIDO CERTIFICACION USO DE SUELO PROYECTO: "AREA VERDE DE LA OTB ESCALERANI" JOT US/086/2019 Fecha: Sacaba, 31 de Julio del 2019. El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, a través de su Secretaría Municipal de Planificación y Desarrollo Territorial y la Jefatura de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, certifica: De acuerdo a la información proporcionada por la Ing. Carolina Coca Cespedes ENCARGADA I GESTION DE RIESGOS Y MICROCUENCA EN LA OTB ESCALERANI, está ubicado dentro la jurisdicción del municipio de Sacaba, con los siguientes datos técnicos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DES. TERRITORIAL CERTIFICACION DE UBICACION DE PREDIO SOBRE COTA 2750. DOCUMENTO COLINDANCIAS SUPERFICIE. De acuerdo a la información proporcionada por el interesado, el Predio Corresponde a: Urbanización "Fabril Huayllani". Aprobado con: R.M. 478/85 de Fecha 15/05/1985. Matanza LL2. Lot 17.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DES. TERRITORIAL CERTIFICACION DE UBICACION DEL PREDIO. En atención al previsible emitido por la Dirección de Asesoría Legal del GAM de Sacaba N° 001/2019/DIR-AL-004/2019, se realiza la presente certificación de ubicación del predio ubicado en: CONCEPCIÓN LÓPEZ DE LABOAMA, al respecto se tiene a informar lo siguiente: 1. En función a la información proporcionada por Concepción López de Laboama en su plano geo-referenciado y la inspección de campo realizada para verificar la situación física del predio se establece que el mismo se encuentra ubicado en la Zona Urbana del Distrito Laya Laya, Municipio Sacaba, DELIMITACIÓN URBANA, en Zona Urbana Extensiva, aprobado por las O.M. 08/2012 y O.M. 02/2013, homologado mediante R.S. 11661 del 24 de enero de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION Y DES. TERRITORIAL CERTIFICACION DE USO DE SUELO. Mediante la presente se tiene a bien informar respecto a la Hoja de Plano N° 7370/19 del Sr. Jherald L. León Quiroz, en calidad de Director Departamental Agencia Estatal de Vivienda de Cochabamba, el cual se encuentra en esta Jefatura ordenado a puntualizar lo siguiente: CONCLUSIONES: 1. En función a la información que ha sido proporcionada por el interesado Proyecto de Ing. Jherald L. León Quiroz de (Inspector Vivienda Nueva Auto Construcción en el Municipio de Sacaba Faja x 2019- Cochabamba se realizó el presente trámite administrativo. (Bajo el principio de presunción de la buena fe del Administrado). Se determina lo siguiente: a. Uso de suelo "URBANO CONSOLIDADO A DENSIFICAR", se permite el uso habitacional colectivo con crecimiento vertical y horizontal, son compatibles actividades administrativas, comerciales, financieras, educativas, recreacionales, religiosas, sociales, culturales, deportivas y huertos urbanos.




NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO	
MUNICIPAL	38 Planos Sectoriales en el área urbana del municipio de Sacaba	20 Planos Sectoriales en el área urbana del municipio de Sacaba concluidos	53%	7 distritos beneficiados, para mejorar el ordenamiento territorial.	20 Planos Sectoriales en el área urbana del municipio de Sacaba para el beneficio de la población en lo referente a la estructuración vial y uso de suelo para los trámites correspondientes.	

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO	
MUNICIPAL	2 Reglamentos específicos para el PDU (Plan Director Urbano) y Planos Sectoriales 1) Áreas urbanas con restricciones 2) Áreas de preservación	0 Reglamentos específicos para el PDU (Plan Director Urbano) y Planos Sectoriales 1) Áreas urbanas con restricciones 2) Áreas de preservación	0%	La población se beneficiara con una normativa que reglamenta el PDU y los planos sectoriales para viabilizar los tramites de aprobación de lote y construcción.		



PLANOS SECTORIALES





A	ACCIONES DE CORTO PLAZO/ OPERACIONES	PROGRAMADO	LOGRADO	% EFICACIA	EVALUACION DE EFICACIA
	Informes técnicos de definiciones (Proyecto de urbanización, Anteproyectos, regularizaciones de predio)	100	165	160%	EFICAZ

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100.000	100.000	96.521,00	96,5 %
ACTIVIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ADQ. PLOTTER MULTIFUNCIONAL	43.270,00	43.270,00	43.270,00	100%
ADQ. ROPA DE TRABAJO PARA SEGURIDAD LABORAL DEL PERSONAL	8.030,00	8.030,00	8.030,00	100%
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y REPUESTOS	48.700	48700	45.221,00	93%



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

CATASTRO



SECTOR : URBANISMO Y VIVIENDA	UNIDAD: CATASTRO
--------------------------------------	-------------------------

OBJETIVO GENERAL	Brindar servicios catastrales para organizar y mantener actualizado el conjunto de datos de la información predial, atendiendo sus características geométricas, físicas y económicas, dirigido a la población sacabeña.
-------------------------	---

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO	
MUNICIPAL	4.628 Certificaciones catastrales	3.915 Certificaciones catastrales emitidas	84,59%	4.628 personas beneficiadas con el certificado catastral.	3.915 personas beneficiadas con el certificado catastral	
DISTRITAL	Certificaciones catastrales <ul style="list-style-type: none"> • D1 - LAVA LAVA= 990 • D2 = 1192 • D3= 316 • D4=1342 • D6= 506 • D7= 282 	Certificaciones catastrales <ul style="list-style-type: none"> • D1 = 727 • D2 = 943 • D3= 251 • D4= 969 • D6= 466 • D7= 247 • LAVA LAVA= 312 				



CERTIFICADO CATASTRAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

JEFATURA DE CATASTRO

Bs. 20.-
Form. SAC001
0017696

CERTIFICADO SOBRE LA PROPIEDAD AL INMUEBLE

RUAT - INMUEBLES
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

USUARIO: COCAFILES.PCB
FECHA: 30/12/2019 09:11

CERTIFICACION DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE Y DATOS TECNICOS NRO. 6565191

De acuerdo a la información registrada a la fecha, en el sistema RUATNET-INMUEBLES, el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, certifica que:

I. DATOS CONTRIBUYENTE (TITULAR)

NOMBRE: ZETH
 APELLIDOS: TAPIA VARGAS
 DOCUMENTO IDENTIFICACION: 802855 PNC: 802855016
 TIPO DOCUMENTO: Cedula de Identidad EXPEDIDO: COCHABAMBA
 TIPO CONTRIBUYENTE: NATURAL ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) GEMERO: FEMENINO
 FECHA NACIMIENTO: 26/07/1952 DOMICILIO LEGAL: CALLE INGAVI S/N, DISTRITO DISTRITO 1 SACABA (URBANA)

Tiene registrada en esta Administración el inmueble con la siguiente información:

II. DATOS ACTUALES INMUEBLE

NUMERO: 1530010264 CODIGO CATASTRAL: 0101400001000

DATOS TECNICOS GENERALES

CLASE: VIVIENDA UNIFAMILIAR AREA: URBANO
 ZONA TRIBUTARIA: ZONAL TIPO PROPIEDAD: UNICA
 UBICACION: CALLE INGAVI #200, DISTRITO DISTRITO 1 SACABA (URBANA)
 REFERENCIA DE UBICACION: ZONA CENTRAL: R-2160/16

DATOS TERRENO

SUPERFICIE (m2)	INCLINACION	MATERIAL VIA	SERVICIOS
79.24	PLANO	CEMENTO	AGUA, LUZ, TELEFONO, ALCANTARILLADO

DATOS CONSTRUCCIONES

BLOQUE	SUPERFICIE (m2)	TIPO CONSTRUCCION	AÑO CONSTRUCCION	GESTION
B1	220.68	BUENA	2015	2015

Los datos técnicos del inmueble y del contribuyente certificado en este documento corresponden a datos actuales asociados al inmueble.

Es cuanto se certifica para fines que convengan al (los) interesado(s), según solicitud de fecha 23/12/2019. Este documento no tiene validez sin el sello y firma de la autoridad competente.

Sacaba, 30 de diciembre de 2019

Firma Responsable
Orlando Capriles Urdutza
ENCARGADO DE CATASTRO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

Firma
LUIS CRISTIAN...
JEFE DE CATASTRO MULTIFUNCIÓN
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

Sello
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	1.085 empadronamientos prediales	1.765 empadronamientos prediales concluidos	100% (ADICIONAL 62,67%)		1.085 personas beneficiadas con el registro de sus predios en el sistema catastral	1.765 personas beneficiadas con el registro de sus predios en el sistema catastral y en padrón tributario
DISTRITAL	Empadronamientos <ul style="list-style-type: none"> D1 - LAVA LAVA= 525 D2 = 77 D3= 38 D4=204 D6= 211 D7= 30 	Empadronamientos <ul style="list-style-type: none"> D1 = 282 D2 = 31 D3= 33 D4= 229 D6= 659 D7= 162 LAVA LAVA= 369 				


NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	245 trámites judiciales	132 trámites judiciales concluidos	55,88%		245 personas atendidos en sus requerimientos judiciales , que coadyuvan a la población en la resolución de conflictos.	132 personas atendidos en sus requerimientos judiciales , que coadyuvan a la población en la resolución de conflictos.
DISTRITAL	Trámites judiciales <ul style="list-style-type: none"> D1 - LAVA LAVA= 70 D2 = 3 D3= 20 D4= 30 D6= 109 D7= 13 	Trámites judiciales <ul style="list-style-type: none"> D1 = 43 D2 = 14 D3= 10 D4= 15 D6= 13 D7= 16 LAVA LAVA= 21 				



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	82 Certificaciones de avalúo catastral	215 Certificaciones de avalúo catastral	100% (ADICIONAL 162%)		82 personas beneficiados con los avalúos catastrales que coadyuvan a la población en la prosecución de otros trámites	215 personas beneficiados con los avalúos catastrales que coadyuvan a la población en la prosecución de otros trámites.
DISTRITAL	Certificaciones de Avalúo Catastral <ul style="list-style-type: none"> D1 - LAVA LAVA= 27 D2 = 15 D3= 10 D4=10 D6= 10 D7= 10 	Certificaciones de Avalúo Catastral <ul style="list-style-type: none"> D1 = 54 D2 = 21 D3= 13 D4= 15 D6= 83 D7= 17 LAVA LAVA= 12 				

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	168 certificaciones de Ley 247 emitidas (Certificación de código eventual)	20 certificaciones de Ley 247 concluidos	11,9% (La baja ejecución se debe a que la vigencia de la Ley 247 ha finalizado en mayo del 2019)		168 personas atendidas con certificaciones emitidas, que apoyan a la población en la perfección de su derecho propietario.	20 personas atendidas con certificaciones emitidas, que apoyan a la población en la perfección de su derecho propietario.
DISTRITAL	Certificaciones Ley 247 <ul style="list-style-type: none"> D1 - LAVA LAVA= 35 D2 = 10 D3= 13 D4=22 D6= 106 D7= 9 	Certificaciones de Avalúo Catastral <ul style="list-style-type: none"> D1 = 9 D2 = 2 D3= 2 D4= 2 D6= 0 D7= 5 LAVA LAVA= 0 				


CERTIFICACION DE AVALUO CATASTRAL




GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

UNIDAD DE CATASTRO

Sacaba, martes 29 de octubre de 2019
CITE:AV/SMPDT/ DGUT/UCA/067/2019





A: Humberto Sanchez Sanchez
H. ALCALDE MUNICIPAL DE SACABA

VÍA: Lic. Lucero Challapa P.
JEFA II DE CATASTRO MULTIFINALITARIO

DE: Arq. Vladimir Hinojosa P.
ENC. DE MEJORA CONTINUA DE CATASTRO

REF: AVALUO CATASTRAL

Mediante la presente se tiene a bien informar respecto al tramite asignado como Hoja de Ruta N° H.R. 13498/19, el cual solicita mediante memorial de fecha 24 de Octubre de 2019, firmado por Nelly Fidencia Heredia Sandoval de Ponce, mediante la cual solicita el **Avaluó Catastral**.

De acuerdo a la inspección técnica realizada por mi persona al lote de terreno, ubicado en la Zona de **Olmos Rancho Chimboco**, según Titulo, verificado el plano catastral, limites indicados por el interesado y documentación adjunta el predio cuenta con una sup. de 1178.43 m2 según titulo, con matricula computarizada N° 3.10.1.01.0032736 asiento A-7 de fecha 10/08/2018 el cual adjunta un Proceso Sucesorio sin testamento y/o declaratoria de Herederos.(Sucre - Chuquisaca) con N° 088/2019 de fecha 14/10/2019.

Superficie: (m2): 1178,43
Zona Homogenea: Zona 5
Inclinación: Plano
Material en Via: Ripio
Valor Terreno m2: 27,32
Servicios Básicos: Agua: Luz: Teléfono: Alcantarillado:

En dicha inspección se evidencia la existencia de bloques de construcción:

DATOS SEGÚN SISTEMA DE CATASTRO				DATOS SEGÚN INSPECCIÓN			
B.1	Año:	Sup.:	Tip Const.:	Año: 2018	Sup: 38	Tipos Const.: ECONOMICA	Valor M2: 645
B.2	Año:	Sup.:	Tip Const.:	Año: 2018	Sup: 2,24	Tipos Const.: ECONOMICA	Valor M2: 645

Por lo expuesto anteriormente se tiene el Valor Catastral Según la Tabla de Valuación de Terreno y construcciones, expresada en Bs. SEGÚN TABLAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2018 (Certificación de Base Imponible y/o Valor Catastral según tablas y verificación técnica en sitio):

VALOR CATASTRAL DEL TERRENO (Bs.):	19.317
VALOR CATASTRAL DE LA CONSTRUCCION (Bs.):	25.955
VALOR CATASTRAL TOTAL (terreno + construcciones) (Bs.):	45.272

Es cuanto se certifica.
Atentamente,

[Signature]
Vladimir Hinojosa P.
ENC. DE MEJORA CONTINUA DE CATASTRO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

[Signature]
JEFA II DE CATASTRO MULTIFINALITARIO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

Nota: El presente informe, determina la situación física técnica del predio y no así el derecho propietario sobre el inmueble.

Dirección: Pasaje Consistorial S-002 - Teléfono: N°: Píloto 4701677 - 4702301 - 4703059 - Fax interno: 143
E-mail: info@sacaba.gob.bo - Página web: www.sacaba.gob.bo
Sacaba - Cochabamba - Bolivia

CERTIFICACION LEY 247-ASIGNACION CODIGO EVENTUAL



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor

JEFATURA DE CATASTRO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA
CERTIFICACION N° CER/SMPDT/DGUT/UCA/ 005/2019




En respuesta al trámite N° **L-01/19 H.R.-1319/19**, el (la) Sr. (a) **ELVARINA SANDOVAL VIGABRIEL**, con Cedula de Identidad N° **3158770 CBBA**, solicita al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, inscripción provisional de Código Catastral.

A este efecto de coadyuvar para que las poseedoras beneficiarias y/o poseedores beneficiarios reconocidos en el art. 9 de la Ley 247, accionen proceso judicial de regularización individual, deberán solicitar al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba; **Certificación de plano Individual referencial e Inscripción de Código Catastral**.

En este sentido bajo los principios establecidos en el Art. 4 incisos c), e) y g) de la ley N° 2341 (Procedimiento Administrativo) y con la certificación de la Dirección de Urbanismo N° **ERC. 77/2019** 22 de Marzo de 2019, emitido por el Arq. Elwin Robles Challaigua Jefe de Servicio de Urbanismo.

SE CERTIFICA:

Que el predio del Sr(a). **ELVARINA SANDOVAL VIGABRIEL**, con Cedula de Identidad N° **3158770 CBBA**, cuenta con el siguiente Código Catastral Provisional que está inscrito en el libro de actas aperturado de fecha 23 de junio de 2014.

Cód. Catastral: **21-152-00522-000**

Zona: **Banda Pampa**

Sup: **142.04 m2 (Según plano)**

Nota: el presente Código Provisional será ratificado a momento de que el beneficiario/beneficiaria presente su derecho propietario registrado en oficinas de Derechos Reales a la conclusión del proceso judicial de Regularización Individual.

Es cuanto certifico para fines consiguientes del interesado.

Sacaba, 02 de Abril de 2019

[Signature]
Daniel Quiñan Fariña
JEFE DE REGISTRO Y ASISTENCIA AL CIUDADANO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA

[Signature]
Lic. Lucero Challapa P.
JEFA II DE CATASTRO MULTIFINALITARIO
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA



Arq.Fs 1.
Cc.Arch.

Dirección: Pasaje Consistorial S-002 - Teléfono: N°: Píloto 4701677 - 4702301 - 4703059 - Fax interno: 143
E-mail: info@sacaba.gob.bo - Página web: www.sacaba.gob.bo
Sacaba - Cochabamba - Bolivia





NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	7 espacios de socialización sobre temáticas de tramites administrativos de catastro.	11 talleres de socialización sobre empadronamiento predial	100%	500 personas con conocimientos sobre tramites de urbanismo.	500 personas con conocimientos sobre tramites de catastro
	2 proyectos normativos elaborados: <ul style="list-style-type: none"> Decreto Municipal 004/2017 actualizado Proyecto de Ley de Catastro 	1 Proyecto de Decreto Municipal 004/2017 elaborado		7 distritos urbanos beneficiados con la normativa	Propuesta de actualización de Decreto 004/2017 elaborada
	Datos catastrales del área intensiva migrados al SEICU	SEICU instalado en servidor del GAM Sacaba en VERSIÓN PRUEBA	20%		



Socialización Decreto de empadronamiento





**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

OBRAS PÚBLICAS



SECTOR : INFRAESTRUCTURA	UNIDAD: OBRAS PUBLICAS
-------------------------------------	-------------------------------

OBJETIVO GENERAL	Control de la Ejecución de 126 Proyectos de la gestión 2019 y 61 proyectos de continuidad de gestiones anteriores, según Contrato en el área Urbana y Rural del Municipio de Sacaba.
-------------------------	--

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO		PRODUCTO LOGRADO		PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
					% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	Ejecución Física de 126 proyectos gestión 2019 y 61 proyectos gestiones anteriores, según contrato en el área urbana y rural.		256 proyectos ingresados 219 proyectos concluidos (c) 22 proyectos en ejecución (e) 2 proyectos paralizados (p) 13 proyectos por iniciar (pi)		100%		ESPERADO	ALCANZADO
								SE CONTRIBUYÓ A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DE IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EN LOS DIFERENTES SECTORES.
DISTRITAL	DISTRITO 1	10	12	(c=9, pi=3)	% EJECUCION FISICA POR DISTRITO		D1 - 68,47% DA - 82,16% D2 - 87,44% DCH - 95,89% D3 - 91,29% DLL - 96,66% D4 - 100% DP - 77,52% D5 - 91,38% DU - 79,19% D6 - 98,09% GLB - 66,65% D7 - 100%	
	DISTRITO 2	14	13	(c=11, pi=2)				
	DISTRITO 3	3	17	(c=14, e=2, pi=1)				
	DISTRITO 4	9	1	(c=1)				
	DISTRITO 5	12	12	(c=10, pi=2)				
	DISTRITO 6	2	7	(c=6, pi=1)				
	DISTRITO 7	7	6	(c=6)				
	D. AGUIRRE	4	2	(c=1, e=1)				
	D. CHIÑATA	14	19	(c=17, e=2)				
	D. LAVA LAVA	10	10	(c=7, e=2, pi=1)				
	D. PALCA	7	10	(c=7, e=3)				
D. UCUCHI	10	13	(c=10, e=2, pi=1)					
MUNICIPALES (GLOBALES)	24	134	(c=120, e=10, p=2, pi=2)					




PROYECTOS DE CONTINUIDAD DE GESTIONES ANTERIORES

DISTRITOS	CANTIDAD DE PROYECTOS
DISTRITO 1	3
DISTRITO 2	8
DISTRITO 3	11
DISTRITO 4	1
DISTRITO 5	4
DISTRITO 6	2
DISTRITO 7	4
D. CHIÑATA	0
D. LAVA LAVA	2
D. PALCA	3
D. UCUCHI	4
MUNICIPALES GLOBALES	19
TOTAL	61



EJECUCION FISICA EN OBRAS

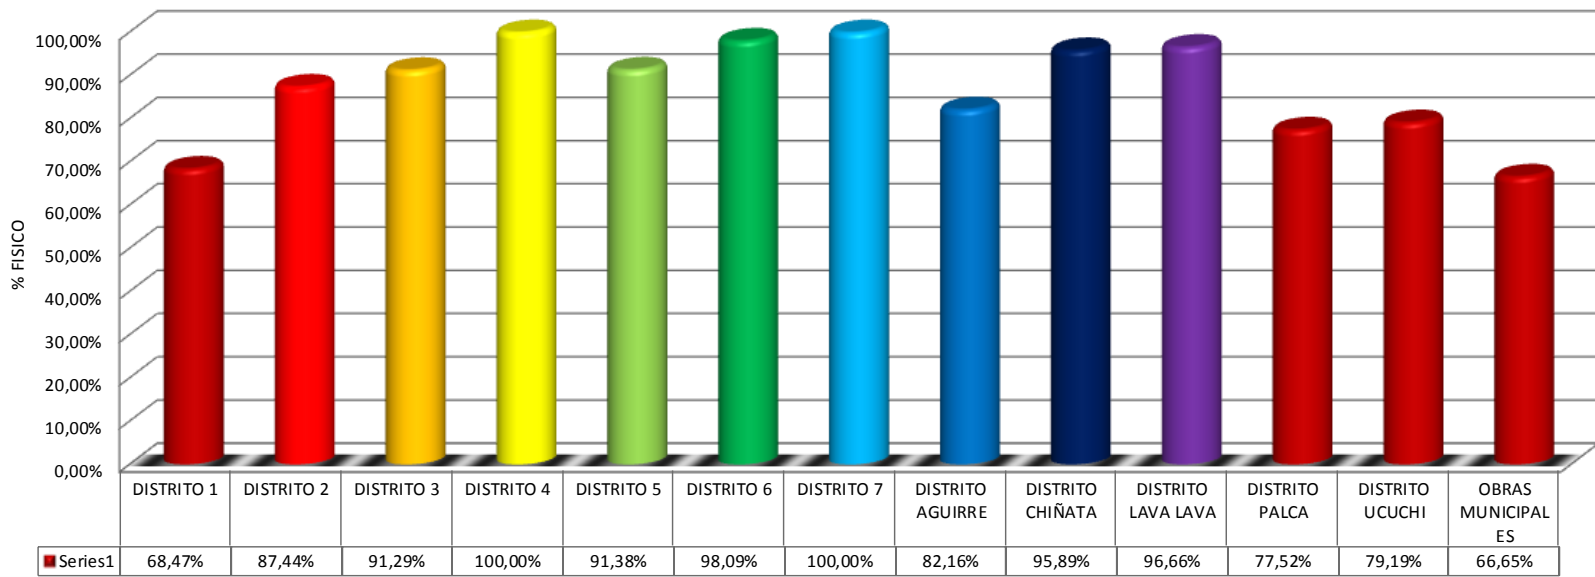

DISTRITOS	% DE AVANCE
DISTRITO 1	68,47%
DISTRITO 2	87,44%
DISTRITO 3	91,29%
DISTRITO 4	100,00%
DISTRITO 5	91,38%
DISTRITO 6	98,09%
DISTRITO 7	100,00%
DISTRITO AGUIRRE	82,16%
DISTRITO CHIÑATA	95,89%
DISTRITO LAVA LAVA	96,66%
DISTRITO PALCA	77,52%
DISTRITO UCUCHI	79,19%
OBRAS MUNICIPALES	66,65%



AVANCE FÍSICO-ECONÓMICO GENERAL OBRAS GENERAL **72,60%**





DISTRITO 1

Nº APERTURA PROGAMA-TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES - TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
		EJ. CONC.	P. EJ.	PAR.		FISICO	ECONOM.				
9	PROYECTOS CONCLUIDOS										
17 0005 000	AMPL. PAVIMENTO DISTRITO 1 (AV. SANTA CRUZ- CORDONES Y CUNETAS)	1				100,00%	100,00%		93.611,45	93.611,45	PROYECTO EJECUTADO.
20-0000-030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD(PINTURA EXTERIOR MATERNOLOGICO HOSP. MEXICO)	1				100,00%	100,00%		116.000,00	116.000,00	PROYECTO EJECUTADO.
21 13120082100000 000	MEJ. DE 3 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 1 (COMP. 1 ALEROS PARA GRADERIAS U.E. JOSE LEONCIO CAPRILES)	1				100,00%	100,00%		79.900,91	79.900,91	PROYECTO EJECUTADO.
21 13120082100000 000	MEJ. DE 3 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 1 (COMP. 2 GRADERIA ALERO PARA CANCHA MULTIPLE U.E. ISAAC MALDONADO REQUE)	1				100,00%	100,00%		89.995,34	89.995,34	PROYECTO EJECUTADO.
21 13120082100000 000	MEJ. DE 3 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 1 (COMP. 3- TANQUE BAJO DE Hªº U.E. CURUBAMBA)	1				100,00%	100,00%		41.092,56	41.092,56	PROYECTO EJECUTADO.
20 0 21	SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MEXICO (MANTENIMIENTO LABORATORIO DE EQUIPAMIENTO HOSPITAL MEXICO (MANTENIMIENTO LABORATORIO BACTEROLOGIA)	1				100,00%	100,00%		27.809,47	27.809,47	PROYECTO EJECUTADO.
23 - 13120039000000 - 000	RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA (RESTAURACION CUBIERTA NORTE Y ESTE)	1				100,00%	100,00%		526.121,17	526.121,17	PROYECTO EJECUTADO.
17 13120095700000 000	"CONST. EMPEDRADO Y CORDONES OTB ORONCOTA DISTRITO 1"	1				100,00%	100,00%		29.996,65	29.996,65	PROYECTO EJECUTADO.
17 13120073100000 000	AMPL. PARQUE PREHISTORICO SACABA (MANADA DE VELOCIRAPTORS)	1				100,00%	100,00%		95.488,16	95.488,16	PROYECTO EJECUTADO.
						TOTALES:		0,00	1.100.015,71	1.100.015,71	



3	PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES								
21 13120096100000 000	"CONST. TINGLADO PARA CANCHA MULTIPLE U.E. JOSE LEONCIO CAPRILES DISTRITO 1"		1					187.703,19	EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
23 0 005	"SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO MUSEO MUNICIPAL (MANT. DE CUBIERTA)		1					46.074,36	EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
20 131200960 00000 000	MEJ. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1ER NIVEL SAN JUAN DE DIOS (REMODELACION)		1					272.877,99	EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
		TOTALES:						0,00 1.606.671,25 1.100.015,71	



"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (PINTURA EXTERIOR MATERNOLOGICO HOSP. MEXICO)"



- * Costo de la Obra: 116.000,00 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA (RESTAURACIÓN CUBIERTA NORTE Y ESTE)



- * Costo de la Obra: 526.121,17 Bs
- * Avance físico: 100.00%
- * Estado del proyecto : **EJECUTADO**



DISTRITO 2

Nº	APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUESTADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.				
11		PROYECTOS CONCLUIDOS										
17 0028 000		CONST. PAVIMENTO DISTRITO 2 (ZONA SUD - OBRAS PRELIMINARES)	1				100,00%	100,00%	377.397,19	377.397,19	PROYECTO EJECUTADO.	
17 0028 000		CONST. PAVIMENTO DISTRITO 2 (OBRAS PRELIMINARES - OTB SAN PEDRO NORTE, BOLIVIA, SUMAJ WASI, SAN PEDRO MAGISTERIO)	1				100,00%	100,00%	91.305,23	70.035,40	PROYECTO EJECUTADO.	
17 0030 000		CONST. EMPEDRADO Y CORDONES DISTRITO 2 (INGRESO PUENTE VEHICULAR RIO MAYLANCO)	1				100,00%	100,00%	88.588,85	88.588,85	PROYECTO EJECUTADO.	
17 0031 000		CONST. CENTRO DE CAPACITACION GENERO OTB CHACACOLLO OESTE (CONTINUACION DE ENMALLADO - ACERAS)	1				100,00%	100,00%	88.952,23	88.952,23	PROYECTO EJECUTADO.	
21 0014 000		CONST. CERRAMIENTO Y TINGLADO PARA CANCHA MULTIPLE U.E. JOSE VIA GARCIA (CERRAMIENTO PERIMETRAL)	1				100,00%	100,00%	115.501,59	115.501,59	PROYECTO EJECUTADO.	
31 0001 000		CONST. CANALIZACION TORRENTERA MONJAS MAYU DISTRITO 2	1				100,00%	100,00%	1.075.623,70	1.126.506,26	PROYECTO EJECUTADO.	
31 0007 000		CONST. CANALIZACION TORRENTERA CHICAMAYU DISTRITO 2 (PUENTE CAJON VILLA ANIMAS)	1				100,00%	100,00%	99.999,84	99.999,84	PROYECTO EJECUTADO.	
21 13120082200000 000		MEJ. DE 4 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 2 (COMP. 1 ALEROS EN CANCHA MULTIPLE Y CUBIERTA DE RESGUARDO PARA EL INGRESO PRINCIPAL U.E. BOLIVIANO JAPONES)	1				100,00%	100,00%	84.925,73	84.925,73	PROYECTO EJECUTADO.	
21 13120082200000 000		MEJ. DE 4 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 2 (COMP. 3- TINGLADO EN CANCHA MÚLTIPLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS U.E. PAULO FREIRE)	1				100,00%	100,00%	49.962,83	49.962,83	PROYECTO EJECUTADO.	
21 13120082200000 000		MEJ. DE 4 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 2 (COMP. 4 GRADERIAS Y MURO PERIMETRAL LADO OESTE U.E. ARCO IRIS)	1				100,00%	100,00%	79.999,87	79.999,87	PROYECTO EJECUTADO.	
21 13120082200000 000		MEJ. DE 4 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO 2 (COMP. 2- AMPLIACION DE TINGLADO EN CANCHA MÚLTIPLE Y CONSTRUCCIÓN DESARENADOR PLUVIAL U.E. MAX FERNANDEZ ROJAS)	1				100,00%	100,00%	62.988,86	62.988,86	PROYECTO EJECUTADO.	
							TOTALES:		0,00	2.215.245,92	2.244.858,65	



0	PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES									
20 0 024	SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO 1ER NIVEL - HOSPITAL SOLOMON KLEIN (MANTENIMIENTO CUBIERTA, PINTURA, BAÑOS Y AREAS DE SERVICIO			1				85.070,71		EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
31 13120049500000 000	"CONST. CANALIZACION TORRENTERA MONJAS MAYU DISTRITO 2			1				266.993,11		EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
	0 PROYECTOS EN CONTRATACIONES									
								TOTAL:		
				TOTALES:				0,00	2.567.309,74	2.244.858,65



CONST. PAVIMENTO DISTRITO 2 (ZONA SUD - OBRAS PRELIMINARES)



- * Costo de la Obra: 377.397,19 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. CERRAMIENTO Y TINGLADO PARA CANCHA MULTIPLE U.E. JOSE VIA GARCIA (CERRAMIENTO PERIMETRAL)



* Costo de la Obra: 115.501,59 Bs

* Avance físico: 100%

* Estado del proyecto: **EJECUTADO**



Nº	APERTURA PROGAMA-TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUESTADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.				
	2	PROYECTOS EN EJECUCIÓN										
17	131200026000000	"CONST. EMPEDRADO Y CORDONES DISTRITO 3 (OTB RODEO PAMPA)	1				50,00%	40,04%		151.999,53	60.799,81	PROYECTO EN EJECUCION.
20	13120045000000	"CONST. CENTRO DE SALUD D-3 (ILUMINACION, CIELO FALSO SALA DE PARTOS Y MESONES C. ODONTOLOGICO)	1				90,00%	86,73%		21.339,61	18.507,84	PROYECTO EN EJECUCION.
								TOTALES:	0,00	173.339,14	79.307,66	
	14	PROYECTOS CONCLUIDOS										
12	0014 000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO DISTRITO 3 (PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA HUERTA MAYU - ESTANQUE)	1				100,00%	100,00%		18.871,87	18.871,87	PROYECTO EJECUTADO.
17	0006 000	CONST. PAVIMENTO DISTRITO 3 (PAVIMENTO RIGIDO OTB PRIMAVERA)	1				100,00%	100,00%		32.733,59	32.733,59	PROYECTO EJECUTADO.
17	0007 000	CONST. PARQUES Y AREAS VERDES ESCALERANI, GUADALQUIVIR, URB. VILLA GRACIELA, V. BARRIENTOS, 14 DE SEPT. (CONST. RECORRIDOS EN AREA VERDE OTB VILLA BARRIENTOS)	1				100,00%	100,00%		99.999,51	99.999,51	PROYECTO EJECUTADO.
17	0007 000	CONST. PARQUES Y AREAS VERDES ESCALERANI, GUADALQUIVIR, URB. VILLA GRACIELA, V. BARRIENTOS, 14 DE SEPT. (OTB 14 DE SEPTIEMBRE-MIRADOR)	1				100,00%	95,51%		99.999,92	95.510,76	PROYECTO EJECUTADO.
17	0007 000	CONST. PARQUES Y AREAS VERDES ESCALERANI, GUADALQUIVIR, URB. VILLA GRACIELA, V. BARRIENTOS, 14 DE SEPT. (OTB GUADALQUIVIR)	1				100,00%	100,00%		99.995,51	99.995,51	PROYECTO EJECUTADO.
17	0007 000	CONST. PARQUES Y AREAS VERDES ESCALERANI, GUADALQUIVIR, URB. VILLA GRACIELA, V. BARRIENTOS, 14 DE SEPT. (TANQUE BAJO DE PVC OTB ESCALERANI)	1				100,00%	100,00%		21.301,84	21.301,84	PROYECTO EJECUTADO.
17	0011 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE AV. SEGUNDA CIRCUNVALACION D-3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	1				100,00%	96,50%		382.516,38	369.118,61	PROYECTO EJECUTADO.
17	0037 000	CONST. EMPEDRADO Y CORDONES DISTRITO 3 (OTB VILLA EL MAR)	1				100,00%	100,00%		49.997,25	49.997,25	PROYECTO EJECUTADO.
22	0001 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS DISTRITO 3 (OTB VIRGEN DE LUJAN)	1				100,00%	100,00%		161.313,15	168.552,50	PROYECTO EJECUTADO.
22	0001 000	MEJORAMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS DISTRITO 3 (OTB 14 DE SEPTIEMBRE ACERA Y MURO DE RESGUARDO)	1				100,00%	100,00%		19.176,55	19.176,55	PROYECTO EJECUTADO.
22	0001 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS DISTRITO 3 (OTB VIRGEN DE LUJAN MURO DE RESGUARDO Hº Cº)	1				100,00%	100,00%		30.539,16	30.539,16	PROYECTO EJECUTADO.
22	0001 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS DISTRITO 3 OTB 4 DE AGOSTO RAMPAS Y JUEGO DE GIMNASIO)	1				100,00%	100,00%		19.858,01	19.858,01	PROYECTO EJECUTADO.
21	131200833000000	"CONST. AREAS DE APOYO U.E. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ DISTRITO 3 (OBRA GRUESA)	1				100,00%	100,00%		184.662,45	184.662,45	PROYECTO EJECUTADO.
20	131200450000000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO 3 (RE FUNCIONALIZACIÓN PRIMER PISO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	1				100,00%	100,00%		379.343,74	370.981,63	PROYECTO EJECUTADO.
								TOTALES:	0,00	1.600.308,93	1.581.299,24	



1		PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES								
21	131200833000000000	"CONST. AREAS DE APOYO U.E. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ DISTRITO 3 (OBRA FINA AREA ADMINISTRATIVA"	1						45.300,77	EL PROYECTO NO LLEGO A SMIS
							TOTAL:			
							TOTALES:	0,00	1.818.948,84	1.660.606,90



"MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS DISTRITO 3 (OTB VIRGEN DE LUJAN)"



Costo de la Obra Bs. 168.552,50
*** Avance físico: 100,00%**
***Estado del proyecto: EJECUTADO**



**"CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO 3 (RE
FUNCIONALIZACION PRIMER PISO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS)"**



Costo de la Obra Bs. 379.343,74
*** Avance físico: 100,00%**
***Estado del proyecto: EJECUTADO**



DISTRITO 4

Nº	APERTURA PROGAMA-TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.				
0		PROYECTOS EN EJECUCIÓN										
								TOTALES:	0,00	0,00	0,00	
1		PROYECTOS CONCLUIDOS										
31 0008 000		CONST. CANALIZACION TORRENTERA SAPANANI DISTRITO 4 (EMBOVEDADO CANALIZACION OTB LAB)	1				100,00%	100,00%		65.999,87	65.999,87	PROYECTO EJECUTADO.
								TOTALES:	0,00	65.999,87	65.999,87	
								TOTAL:				
								TOTALES:		65.999,87	65.999,87	



CONST. CANALIZACION TORRENTERA SAPANANI DISTRITO 4 (EMBOVEDADO CANALIZACION OTB LAB)



- * Costo de la Obra: 65.999,87Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



“CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO LARATY (CONST. ATAJADO CON GEOMEMBRANA LARATY GRANDE)”



- * Costo de la Obra Bs.: 99.997,44
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



"CONST. SISTEMA DE MICRORIEGO OLMOS KOLUYO D5-SACABA"



- * Costo de la Obra Bs.: 3.053.403,90
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



1	PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES										
20 13120045200000 000	"AMPL. CENTRO DE SALUD EL ABRA (PERFORACION DE POZO)"			1					145.866,97		PROYECTO NO LLEGO A SMIS
						TOTAL:		0,00			
						TOTALES:		0,00	892.407,78	732.315,29	



AMPL. CENTRO DE SALUD EL ABRA (OBRA GRUESA QUIROFANOS)



- * Costo de la Obra: 459.319,59 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. EMPEDRADO Y CORDONES DISTRITO 6 (OTB ABRA CENTRAL)



- * Costo de la Obra: 99.999,16 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



DISTRITO 7

Nº	APERTURA PROGAMA-TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
			EJ. CONC.	P. EJ.	PAR.		FISICO	ECONOM.				
0			PROYECTOS EN EJECUCIÓN									
						TOTALES:		0,00	0,00	0,00		
6			PROYECTOS CONCLUIDOS									
2	12 0009 000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO 7 (EMBOVEDADO CANAL DE RIEGO CALLE COLOMBIA)	0	1	0	0	100,00%	100,00%		99.999,45	99.999,45	PROYECTO EJECUTADO.
3	17 0027 000	CONST. PAVIMENTO DISTRITO 7 (C. COLOMBIA)	0	1	0	0	100,00%	104,40%		320.580,04	334.678,50	PROYECTO EJECUTADO.
3,1	17 0027 000	CONST. PAVIMENTO DISTRITO 7 (P. RIGIDO CALLE COLOMBIA)	0	1	0	0	100,00%	100,00%		346.442,41	346.442,41	PROYECTO EJECUTADO.
	21 0007 000	CONST. LABORATORIOS U.E. BOLIVIANO BRITANICO (ACERAS DE INGRESO Y MURO DE PROTECCIÓN)		1			100,00%	100,00%		53.860,74	53.860,74	PROYECTO EJECUTADO.
	21 13120082700000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA DISTRITO 7 (CONST. MURO PERIMETRAL TRAMO 1 Y 2)		1			100,00%	100,00%		33.973,98	33.973,98	PROYECTO EJECUTADO.
	17 13120061900000 000	"CONST. PAVIMENTO DISTRITO 7 (CORDONES DE CONFINAMIENTO OTB VILLA CLOTILDE)"		1			100,00%	100,00%		20.044,03	20.044,03	PROYECTO EJECUTADO.
						TOTALES:		0,00	874.900,65	888.999,11		





"CONST. PAVIMENTO DISTRITO 7 (C. COLOMBIA)"



- * Costo de la Obra: 334 678,50 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



MEJ. UNIDAD EDUCATIVA ANTOFAGASTA DISTRITO 7 (CONST. MURO PERIMETRAL TRAMO 1 Y 2)



- * Costo de la Obra: 33.973,98 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



DISTRITO RURAL AGUIRRE

N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES	
			EJ.	CONC	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.
1 PROYECTOS EN EJECUCIÓN												
5	21 1312009560000 0 000	CONST. MURO PERIMETRAL U.E. ISMAEL MONTES DISTRITO AGUIRRE	1				65,00%	58,27%	149.959,73	118.125,06	68.830,11	PROYECTO EN EJECUCION.
TOTALES:								149.959,73	118.125,06	68.830,11		
1 PROYECTOS CONCLUIDOS												
4	2213120081500 000 000	CONST. CENTRO DEPORTIVO AGUIRRE (COMPONENTE 1: TINGLADO PARA CANCHA MÚLTIPLE)	1				100,00%	100,00%	133.265,84	133.265,85	133.265,84	PROYECTO EJECUTADO.
TOTALES:								133.265,84	133.265,85	133.265,84		
0 PROYECTOS PARALIZADOS												
TOTAL:								0,00	0,00			
0 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES												
TOTAL:								0,00				
TOTALES:								283.225,57	251.390,91	202.095,95		



CONST. CENTRO DEPORTIVO AGUIRRE (COMPONENTE 1: TINGLADO PARA CANCHA MÚLTIPLE)"



- * Costo de la Obra: 133.265,85 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. MURO PERIMETRAL U.E. ISMAEL MONTES DISTRITO AGUIRRE



- * Costo de la Obra: 118,125,06 Bs
- * Avance físico: 60%
- * Estado del proyecto: **EN EJECUCION**



DISTRITO RURAL CHIÑATA


N°	APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES		
			EJ.	COMC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.	
2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN													
66,9	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CANAL DE RIEGO TRAMO 2 Y TRAMO 3 COMUNIDAD JULLUPAMPA)	1				90,00%	87,84%	34.585,41	34.585,41	30.380,78	PROYECTO EN EJECUCION.	
70	20 0 040	SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE 1ER NIVEL C.S. CATACHILLA ALTA (MANTENIMIENTO INST. ELECTRICA, CONSULTORIOS Y CUBIERTA)	1				1,00%		112.823,01	104.993,27	0,00	PROYECTO EN EJECUCION.	
									TOTALES:	147.408,42	139.578,68	30.380,78	
17 PROYECTOS CONCLUIDOS													
66	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA DE CONDUCCION TRAMO 3 COMUNIDADES MESA PATA Y PATATI CHICO)	1				100,00%	100,00%	122.984,45	102.197,09	102.197,09	PROYECTO EJECUTADO.	
66,1	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CANALES DE RIEGO COMUNIDAD MOLINO BLANCO)	1				100,00%	100,00%	193.817,38	193.817,38	193.817,38	PROYECTO EJECUTADO.	
66,2	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CONST. CANALES DE RIEGO TRAMO 3 COMUNIDAD CHOQUECHAMPI)	1				100,00%	100,00%	137.166,28	137.166,28	137.166,28	PROYECTO EJECUTADO.	
66,3	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA TRAMO 3 COMUNIDAD PATATI GRANDE)	1				100,00%	100,00%	86.441,48	86.441,48	86.441,48	PROYECTO EJECUTADO.	
66,4	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA TRAMO 3, TRAMO 4 Y RAMAL 1 Y 2 COMUNIDAD MAYU MOLINO)	1				100,00%	100,00%	98.102,86	98.102,86	98.102,86	PROYECTO EJECUTADO.	
66,5	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (PERFORACION DE POZO Y TEND. DE TUB. SECTOR TOMA MAYU)	1				100,00%	100,00%	222.164,53	222.164,53	222.164,53	PROYECTO EJECUTADO.	
66,6	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CANALES DE RIEGO SIND. AGRARIO CHIÑATA)	1				100,00%	100,00%	231.547,66	180.011,93	180.011,93	PROYECTO EJECUTADO.	
66,7	12 131200172000000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CONST. CANALES DE RIEGO TRAMO 2 COMUNIDAD PATATI ALTO)	1				100,00%	100,00%	63.032,73	63.024,13	63.024,13	PROYECTO EJECUTADO.	



N°	APERTURA PROGAMA-TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES	
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.
66.8	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CONST. GALERIA FILTRANTE COMUNIDAD JULLUPAMPA)	1				100,00%	100,00%	6.439,95	6.439,95	6.439,95	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO. PROBLEMAS TECNICOS. MONTO CONTRATO: 41.205,82 Bs.
66.9	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA TRAMO 2 COMUNIDAD QUINSA MAYU QUIROGA)	1				100,00%	100,00%	84.852,76	84.774,12	84.774,12	PROYECTO EJECUTADO.
66.a	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO COMUNIDAD PHAJCHA)	1				100,00%	100,00%	84.852,76	84.852,72	84.852,72	PROYECTO EJECUTADO.
66.b	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA DE CONDUCCION TRAMO 4 COMUNIDAD MESA PATA Y PATATI CHICO)	1				100,00%	100,00%	19.993,83	19.993,83	19.993,83	PROYECTO EJECUTADO.
66.c	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA AMPLIACION DE RED TRAMO 3, TRAMO 4 MAYU MOLINO)	1				100,00%	100,00%	21.734,08	21.734,08	21.734,08	PROYECTO EJECUTADO.
66.d	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (TENDIDO DE TUBERIA TRAMO 3 AMPLIACION PATATI GRANDE)	1				100,00%	100,00%	23.600,09	23.600,09	23.600,09	PROYECTO EJECUTADO.
66.e	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CONST. CANALES CHOQUECHAMPI)	1				100,00%	100,00%	22.493,06	22.493,06	22.493,06	PROYECTO EJECUTADO.
66.f	12 13120017200000	CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CANAL PRINCIPAL TRAMO 2 COMUNIDAD MOLINO BLANCO)	1				100,00%	100,00%	22.002,17	22.002,17	22.002,17	PROYECTO EJECUTADO.
69	17 13120065100000	CONST. GUARDERIA CATACHILLA ALTA (OBRA FINA)	1				100,00%	100,00%	100.000,00	99.998,78	99.998,78	PROYECTO EJECUTADO.
								TOTALES:	1.541.226,07	1.468.814,48	1.468.814,48	
0 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES												
								TOTAL:	0,00			
								TOTALES:	1.688.634,49	1.608.393,16	1.499.195,26	



CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHINATA (PERFORACION DE POZO Y TEND. DE TUB. SECTOR TOMA MAYU)

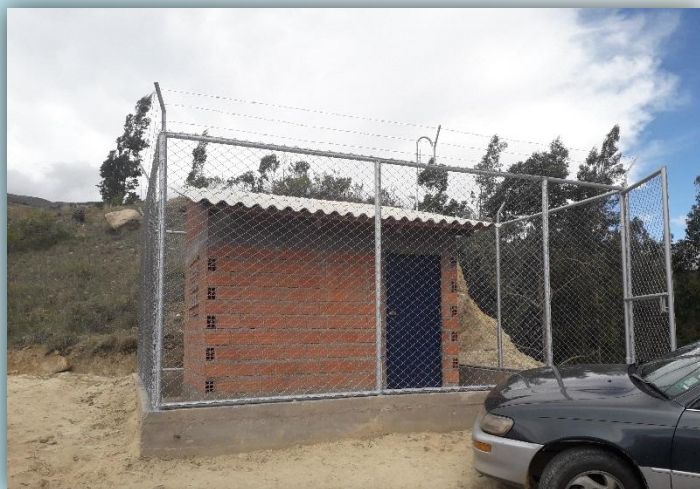

- * Costo de la Obra: 222.164,53 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. SISTEMA MICRO RIEGO DISTRITO RURAL CHIÑATA (CANALES DE RIEGO SIND. AGRARIO CHIÑATA)



- * Costo de la Obra: 180.011,93 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



DISTRITO RURAL LAVA LAVA

N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES		
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.	
2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN													
110	17 1312003660 0000 000	CONST. EMPEDRADO Y CORDONES DISTRITO LAVA LAVA (CANAL PATA)	1				95,00%	92,01%	99.986,60	99.986,60	91.994,51	PROYECTO EN EJECUCION.	
118	21 1312008280 0000 000	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 4 OBRAS COMPLEMENTARIAS ACERAS DE ACCESO U.E. 6 GENEVEVA RIOS)	1				98,00%	94,21%	19.994,14	19.994,14	18.837,40	PROYECTO EN EJECUCION.	
									TOTALES:	0,0	0,0	0,0	
7 PROYECTOS CONCLUIDOS													
108,1	120008000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO DISTRITO LAVA LAVA (PERFORACION DE POZO MOLLOCOTA)	1				100,00%	100,00%	17.873,86	17.873,86	17.873,86	PROYECTO EJECUTADO. MONTO DE CONTRATO:170.733,60 Bs.	
108,2	120008000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO DISTRITO LAVA LAVA (PERFORACION DE DOS POZOS KORIHUMA)	1				100,00%	100,00%	167.709,74	167.709,74	167.709,74	PROYECTO EJECUTADO CON RESOLUCION. MONTO CONTRATO: 336865,97	
113	21 1312008280 0000 000	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 2: OBRA FINA AULA U.E. CARLOS VILLEGAS QUIROGA)	1				100,00%	100,00%	36.973,32	36.973,32	36.973,32	PROYECTO CONCLUIDO.	
114	21 1312008280	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 3- CIELO FALSO DE 7 AULAS U.E. INTI MUJU)	1				100,00%	100,00%	49.354,55	49.354,55	51.804,62	PROYECTO CONCLUIDO.	
115	21 1312008280	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 5- GRADERIA Y ALERO PARA CANCHA MÚLTIPLE U. E. 23 DE MARZO)	1				100,00%	100,00%	89.588,47	89.588,47	89.588,47	PROYECTO CONCLUIDO.	
116	21 1312008280	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 4- RAMPA DE ACCESO U.E. GENEVEVA RIOS)	1				100,00%	100,00%	97.671,96	97.671,96	97.671,96	PROYECTO EJECUTADO	
117	21 1312008280	MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 1- CONCLUSION DE AULA U.E. 6 DE JUNIO)	1				100,00%	100,00%	94.146,71	94.146,71	94.146,71	PROYECTO EJECUTADO.	
									TOTALES:	553.318,61	553.318,61	555.768,68	
1 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES													
109	17 1312002200 0000 000	CONST. PAVIMENTO DISTRITO RURAL LAVA LAVA (OBRAS COMPLEMENTARIAS: CORDONES Y CUNETAS)	0	0	1	0	0,00%	0,00%	71.601,77	71.601,77	0,00	PROYECTO SIN ORDEN DE PROCEDER, NO TIENE AREA DE TRABAJO	
									TOTAL:	71.601,77			
TOTALES:									744.901,12	744.901,12	666.600,59		



CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO DISTRITO LAVA LAVA (PERFORACION DE POZO MOLLOCOTA)



- * Costo de la Obra: 170.733,60 Bs
- * Avance físico: 100.00%
- * Estado del proyecto : **EJECUTADO**



MEJ. DE 6 UNIDADES EDUCATIVAS DISTRITO LAVA LAVA (COMP. 4- RAMPA DE ACCESO U.E. GENOVEVA RIOS)



- * Costo de la Obra: 97.671,96 Bs
- * Avance físico: 100.00%
- * Estado del proyecto : **EJECUTADO**



DISTRITO RURAL PALCA

N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES		
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.	
3 PROYECTOS EN EJECUCIÓN													
86	18 1312009550 0000 000	CONST. PUENTE VEHICULAR TIPO LOZA RIO PISLY Y DISTRITO PALCA	1				1,00%	0,00%	454.997,80	449.033,53	0,0	PROYECTO EN EJECUCION.	
87	20 1312008190 0000 000	CONST. ESTABLECIMIENTO DE SALUD BATEON 8 DE JUNIO DEL DISTRITO PALCA (CONSULTORIO VECINAL)	1				75,00%	72,09%	300.000,00	299.897,06	216.210,66	PROYECTO EN EJECUCION.	
89	21 1312008290 0000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA APILLA DISTRITO PALCA (SECTOR BAÑOS, SECTOR CANCHA MULTIPLE, DESAGUE PLUVIAL Y MURO PERIMETRAL)	1				75,00%	73,94%	72.996,37	72.996,37	53.976,00	PROYECTO EN EJECUCION.	
									TOTALES:	827.994,17	821.926,96	270.186,66	
7 PROYECTOS CONCLUIDOS													
80,2	120010000	CONST. SISTEMAS DE MICRORIEGO DISTRITO RURAL PALCA (PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA KELAMAYU CALUYO GRANDE TRAMO 1)	1				100,00%	100,00%	37.692,83	37.692,83	37.692,83	PROYECTO EJECUTADO.	
81	110011000	CONST. RED DE AGUA POTABLE KEWIÑAL PALCA	1				100,00%	100,00%	400.000,00	398.044,26	398.044,26	PROYECTO EJECUTADO.	
82	12 1312006880 0000 000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PALCA GRANDE DISTRITO PALCA (CONST. SISTEMA MICRO RIEGO)	1				100,00%	100,00%	400.000,00	243.173,80	255.308,18	PROYECTO EJECUTADO.	
83	11 1312001550 0000 000	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE APILLA (ENMALLADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE)	1				100,00%	100,00%	36.397,55	36.397,55	36.397,55	PROYECTO EJECUTADO.	
85	17002000	CONST. SUB ALCALDIA DISTRITO PALCA	1				100,00%	95,01%	130.000,00	130.000,00	98.016,44	PROYECTO EJECUTADO. MONTO DE CONTRATO:458244,39 Bs.	
88	21 1312008140 0000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MAYCA MAYU DISTRITO PALCA	1				100,00%	100,00%	370.644,21	370.644,20	370.644,21	PROYECTO EN EJECUTADO.	
88,1	21 1312008140 0000.000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MAYCA MAYU DISTRITO PALCA (MURO DE PROTECCION DE H°C°)	1				100,00%	100,00%	29.351,20	29.351,20	29.351,20	PROYECTO EJECUTADO	
									TOTALES:	1.404.085,79	1.245.303,84	1.225.454,67	
0 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES													
									TOTAL:	0,00			
									TOTALES:	2.232.079,96	2.067.230,80	1.495.641,33	



"CONST. RED DE AGUA POTABLE KEWIÑAL PALCA"



- * Costo de la Obra: 398.044,26 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



"CONST. UNIDAD EDUCATIVA MAYCA MAYU DISTRITO PALCA"



- * Costo de la Obra: 370.644,21 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



DISTRITO RURAL UCUCHI

N°	APERTURA PROGRAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES	
			EJ.	COMIC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					ECONOM.
2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN												
22.2	12 1312008200 0000 000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO RODEO DISTRITO UCUCHI (TEND. DE TUBERIA TRAMO 2 SECTOR CHAQUI MAYU Y TRAMO 1 SECTOR ALTO UCUCHI EN LA COMUNIDAD DE UTURUNQUILLO)	1				60,00%	57,63%	99.095,47	99.095,47	54.128,39	PROYECTO EN EJECUCION.
29	2013120045 300000 000	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO RURAL UCUCHI (INSTALACIONES ESPECIALES Y OBRA FINA)					52,00%	49,79%	1.000.000,00	998.709,92	497.232,22	PROYECTO EN EJECUCION
								TOTALES:	1.099.095,47	1.097.805,39	551.360,61	
10 PROYECTOS CONCLUIDOS												
19	12 1312001750 0000 000	CONST. SIST. MICRO RIEGO SUBCENTRAL UCUCHI (TENDIDO DE TUBERIA TRAMO 3)	1				100,00%	100,00%	165.706,00	97.994,96	102.762,34	PROYECTO EJECUTADO.
21	120012000	CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KUYOJ KOCHA MELGA (TEND. DE TUBERIA TRAMO 1 VERT. YANA YACU)	1				100,00%	100,00%	3.500,00	3.500,00	3.422,07	PROYECTO EJECUTADO. MONTO DE CONTRATO: 35.729,72
22	12 1312008200 0000 000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO RODEO DISTRITO UCUCHI (CONST. DE CANALES DE RIEGO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CONDUCCION TRAMO 1)	1				100,00%	100,00%	142.750,82	142.750,82	142.750,82	PROYECTO EJECUTADO.
22.1	12 1312008200 0000 000	CONST. SISTEMA DE MICRO RIEGO RODEO DISTRITO UCUCHI (TEND. DE TUBERIA DE CONDUCCION TRAMO 2 KUCHULOMA Y RODEO CENTRO)	1				100,00%	100,00%	28.874,12	28.874,12	28.874,12	PROYECTO EJECUTADO.
27	180001000	CONST. PUENTE VEHICULAR LAQUIÑA TUTIMAYU - SACABA	1				100,00%	93,31%	474.357,39	449.180,35	419.146,35	PROYECTO EJECUTADO. ELAB. DE PLANILLA.
28	21000700	CONST. PUENTE VEHICULAR LAQUIÑA TUTIMAYU - SACABA (SUPERVISION TECNICA)	1				100,00%		24.966,18	24.966,18	0,00	PROYECTO EJECUTADO. SUP. TECNICA
30	20000100	CONST. CENTRO DE SALUD DISTRITO RURAL UCUCHI (ACERAS EXTERIORES - REVOQUES INTERIORES DE RANPA, GRADA Y SALA MÚLTIPLE)					100,00%	100,00%	32.468,14	32.468,14	32.468,14	PROYECTO EJECUTADO. MONTO CONTRATO: 64940,41 Bs.
31	21 1312 00627 00000 000	CONST. AULAS U.E. TUTIMAYU (OBRA GRUESA TERCERA PLANTA)	1				100,00%	100,00%	122.944,98	122.944,98	122.944,98	PROYECTO EJECUTADO.
31.1	21 1312 00627 00000 000	CONST. AULAS U.E. TUTIMAYU (OBRA GRUESA: MURO DE LADRILLO)	1				100,00%	100,00%	27.051,87	27.051,87	27.051,87	PROYECTO EJECUTADO.
32	21 1312008300 0000 000	MEJ. UNIDAD EDUCATIVA CHIMPA MELGA DISTRITO UCUCHI (BAÑOS)	1				100,00%	100,00%	39.928,02	39.928,02	39.928,02	PROYECTO CONCLUIDO.
								TOTALES:	896.841,52	871.664,48	919.348,71	
1 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES												
18	1113120081 600000 000	CONST. PERFORACION DE POZO LAQUIÑA DISTRITO UCUCHI	0	0	1	0	0,00%	0,00%	120.000,00	0,00	0,00	PROYECTO POR EJECUTAR. EN PLANIFICACION.
								TOTAL:	120.000,00			
TOTALES:								2.281.642,99	2.067.464,83	1.470.709,32		





CONST. PUENTE VEHICULAR LAQUIÑA TUTIMAYU - SACABA



- * Costo de la Obra: 449.180,35 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. AULAS U.E. TUTIMAYU (OBRA GRUESA TERCERA PLANTA)



- * Costo de la Obra: 122.944,98 Bs
- * Avance físico: 100 %
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



MUNICIPALES (GLOBALES)

N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL				% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.				
5 PROYECTOS EN EJECUCIÓN												
	11 1312008170 0000 000	CONST. REDES PRIMARIAS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE DISTRITOS URBANOS SACABA (SUBSISTEMA OESTE)					40,00%	56,53%		26.097.504,24	14.752.919,15	PROYECTO EN EJECUCION.
	11 1312008170 0000 000	CONST. REDES PRIMARIAS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE DISTRITOS URBANOS SACABA (SUPERVISION TECNICA SUBSISTEMA OESTE)					40,00%	10,00%		983.000,00	98.300,00	SUPERVISION
	21- 1312008350 0000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA DOMITILA BARRIOS CUENCA NIVEL SECUNDARIO - DISTRITO 4					45,00%	20,00%		5.999.849,42	1.199.969,88	PROYECTO EN EJECUCION FALTA DESEMBOLSO DE LA UPRE
	21 1312008340 0000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA MAX FERNANDEZ ROJAS NIVEL PRIMARIO - DISTRITO 2					80,00%	20,00%		3.619.237,20	723.847,44	PROYECTO EN EJECUCION FALTA DESEMBOLSO DE LA UPRE
	20 1312001340	*CONST. CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SACABA (O. FINA COMPLEMENTARIOS)*					92,00%	69,51%		856.298,15	595.212,84	PROYECTO EN EJECUCION.
	17 1312001890	*CONST. INFRAESTRUCTURA PARA ZOONOSIS SACABA (CANILES Y TANQUES)					25,55%	25,55%		399.942,53	130.181,29	PROYECTO EN EJECUCION.
	20 0 035	*SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE 1ER NIVEL C.S. EL ABRA (MANTENIMIENTO Y REPOSICION CUBIERTA Y MESONES CONSULTORIO ODONTOLOGICO Y MANTENIMIENTO BAÑO Y AREAS DE SERVICIO					85,00%	85,00%		77.605,00	66.166,02	PROYECTO EN EJECUCION.
TOTALES:									0,0	38.033.436,54	17.566.596,63	



38 PROYECTOS CONCLUIDOS											
17	0036 000	CONST. INFRAESTRUCTURA PARA ZONOSIS SACABA (AMPLIACION CUBIERTA Y MURO DE PROTECCION)				100,00%	100,00%		40.499,45	40.499,45	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
17	0042 000	CONST. PASARELA PEATONAL RIO MAYLANCO CHULLPAMOGO				100,00%	100,00%		82.473,26	82.473,26	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
17	0042 000	CONST. PASARELA PEATONAL RIO MAYLANCO CHULLPAMOGO (ENGAVIONADO)				100,00%	100,00%		65.858,62	65.858,62	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
17	0042 000	CONST. PASARELA PEATONAL RIO MAYLANCO CHULLPAMOGO (CHULLPAMOGO - ENTRE RIOS)				100,00%	100,00%		31.386,63	31.386,63	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	0002 000	CONST. CENTRO REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SACABA (ENTUBADO PARA CANAL DE RIEGO Y BOTAGUAS PERIMETRAL DE HªA)				100,00%	100,00%		78.977,16	78.977,16	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	0004 000	CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SOLOMON KLEIN-DISTRITO 2 (SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA-PUERTAS DE PLOMO Y ALUMINIO)				100,00%	100,00%		93.995,59	93.995,59	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	0004 000	CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SOLOMON KLEIN-DISTRITO 2 (INGRESO PRINCIPAL, INGRESO A EMERGENCIA)				100,00%	100,00%		99.998,92	99.998,92	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	0006 000	AMPL. Y MEJORAMIENTO AMBIENTES QUIROFANO, ESTERILIZ. E INTERNACION HOSPITAL MEXICO (OBRA GRUESA, OBRA FINA E INSTALACIONES)				100,00%	100,00%		684.228,66	684.179,63	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
21	0021 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO BICENTENARIO DISTRITO 2				100,00%	84,03%		12.435.834,03	10.449.831,34	PROYECTO EJECUTADO. FALTA DESEMBOLSO DE LA UPRE
21	0022 000	CONST. INSTITUTO TECNOLOGICO BERTO NICOLI DISTRITO 1				100,00%	94,36%		6.781.419,94	6.398.947,86	PROYECTO EJECUTADO. FALTA DESEMBOLSO DE LA UPRE
20	1312001340 0000 000	*CONST. CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SACABA (MURO PERIMETRAL, O.G. BLOQUE SERVICIOS)*				100,00%	100,00%		387.878,10	387.632,94	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
22	0003 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS SACABA (CAMERINOS-BAÑOS OTB CURUBAMBA ALTA)				100,00%	100,00%		71.816,38	71.816,38	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
22	0003 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS SACABA (ENMALLADO DE CANCHA MULTIPLE - OTB LUIS ESPINAL D-6)				100,00%	100,00%		17.971,86	17.971,86	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
23	0002 000	RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA (RESTAURACION DE FACHADA)				100,00%	100,00%		199.871,22	199.871,22	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
23	0002 000	RESTAU. PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA SAN PEDRO DE SACABA (RED DE DESAGUE PLUVIAL)				100,00%	100,00%		99.965,41	99.965,41	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
31	0005 000	CONST. GAVIONES PARA TORRENTERAS SACABA (IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA EL DISTRITO 4 Y LAVA LAVA)				100,00%	104,98%		141.339,94	148.383,96	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ.	CUNC. P.EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.					
17	1312006100 0000 000	CONST. NICHOS ENTERRATORIOS Y PERPETUIDAD CEMENTERIO GENERAL SACABA (CONCLUSIÓN)	1				100,00%	100,00%		787.800,43	787.800,43	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
33	0000 007	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MODULOS Y EPIS POLICIALES (MANT. BAÑOS EPI 1 HUAYLLANI D-1, REPOS.CUBIERTA MODPOL.N°209 CASTILLO D-2, REPARACION PISO DE CEMENTO MOD. POL. N°3 PUNTITI CHICO, REPARACION CUBIERTA Y CIELO FALSO MOD. POLICIAL V. OBRAJES D-7, PINTURA PUERTAMET. INGRESO COMANDO CENTRAL D-1)	1				100,00%	100,00%		41.310,02	41.310,02	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
17	0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES (SUB ALCALDIA D 4)	1				100,00%	100,00%		49.796,98	49.796,98	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	0 002	MATTO. Y MEJOR. DE HOSPITALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER NIVEL (BLOQUE DE SERVICIO C.S. PACATA)	1				100,00%	100,00%		32.315,69	32.315,69	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
13	0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (MTTO. DE DINOSAURIOS PARQUE PREHISTORICO)	1				100,00%	100,00%		49.860,00	49.860,00	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
13	0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PLAZA PRINCIPAL 6 DE AGOSTO)	1				100,00%	100,00%		18.650,45	18.650,45	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
35	0 002	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES (CONEXIONES ELECTRICAS, PINTURA EN FACHADA NORTE Y AMBIENTE DE SINARAP)	1				100,00%	100,00%		49.983,15	49.983,15	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
22	0 002	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS (CANCHAS MULTIPLES OTBS. SIDUMS "B" AMANCAYAS, CHILLUCHI, ULINCATE, ORIENTAL)	1				100,00%	100,00%		173.132,74	173.132,74	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
23	0 004	REFACCIÓN DE PATRIMONIOS CULTURALES(REINTEGRACIÓN DE PINTURAS- REFUERZO DE TIMPANO DEL MUSEO MUNICIPAL DE SACABA)	1				100,00%	100,00%		49.970,63	49.970,63	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
28	0 003	MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE MERCADOS (MERCADO DE ABASTO D-1 " MANT. OBRAS INTERIORES"; MERCADO DE QUINTANILLA D-2 " MANT. DE CUBIERTA DE POLICARBONATO", MERCADO SAN FRANCISCO DE ASIS D-4 "MANT. DE LOSA Y OBRAS INTERIORES")	1				100,00%	100,00%		128.617,00	128.617,00	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
20	1312003460 0000 000	"CONST. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL SOLOMON KLEIN - DISTRITO 2 (ENERGIZACION DATA CENTER)	1				100,00%	100,00%		99.830,52	99.830,52	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGRAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P.EJ.	PAR.	FISICO					
21	1312008240 0000 000	"MEJ. UNIDAD EDUCATIVA CARLOS PEREDO DISTRITO 4 (ALERO, DESAGUE Y PROTECTORES PARA CANCHA MULTIPLE)"	1				100,00%	100,00%		28.163,36	28.163,36	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
17	1312006100 0000 000	"CONST. NICHOS ENTERRATORIOS Y PERPETUIDAD CEMENTERIO GENERAL SACABA (EXHUMADERO)	1				100,00%	100,00%		76.063,15	76.063,15	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
D1	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. EL MORRO)	1				100,00%	100,00%		24.995,93	24.995,93	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. MANCESPED, U.E. ISAC MALDONADO REQUE)	1				100,00%	100,00%		44.998,01	44.998,01	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ELIODORO VILLAZON)	1				100,00%	100,00%		44.996,42	44.996,42	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. NATALIO ARAUCO, U.E. TORIBIO CLAURE)	1				100,00%	100,00%		24.992,29	24.992,29	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. GERMAN BUSCH, U.E. KINDER MARIA ALBORTA)	1				100,00%	100,00%		36.179,37	36.179,37	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. CHIMBOCO)	1				100,00%	100,00%		49.666,92	49.666,92	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. JOSE NICOLAS MALDONADO)	1				100,00%	100,00%		49.930,77	49.930,77	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. RAMON G. PRADA)	1				100,00%	100,00%		39.997,37	39.997,37	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ROBERTO NICOLI, U.E. BOLIVIA Y U.E. EMILIANO VILLAZON)	1				100,00%	100,00%		49.991,52	49.991,52	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. REPUBLICA DE ITALIA)	1				100,00%	100,00%		28.601,90	28.601,90	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGRAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. JOSE LEONCIO CAPRILES)	1				100,00%	100,00%		10.752,22	10.752,22	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (MANTENIMIENTO MURO PERIM. Y PUERTA DE SEGURIDAD TIPO REJA U.E. ELIODORO VILLAZON)	1				100,00%	100,00%		16.600,66	16.600,66	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	33 0 007	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO MODULOS Y EPIS POLICALES (REPOS. MAMPARA DE ALUMINIO COMANDO CENTRAL D-1, REV. DE YESO INC. REM. Y PINTURA EPI HUAYLLANI D-1, REM. Y REPOS. PLACA OND. FIBRO RADIO PATRULLA110 D-2 Y REPOS. PUERTA MET. DE SEGURIDAD EPI 6 PAC D-6)	1				100,00%	100,00%		49.997,38	49.997,38	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	13 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (MTTO. PASAJE PEATONAL MONSEÑOR ALCOCER-PASAJE CONSISTORIAL-MTTO POSTES PLAZA D1)	1				100,00%	100,00%		49.979,54	49.979,54	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	17 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES (ALCALDIA MUNICIPAL)	1				100,00%	100,00%		49.780,17	49.780,17	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	35 0 002	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES (CASSETAS Y PINTURA INTERIOR LADO SUD)	1				100,00%	100,00%		49.980,20	49.980,20	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	22 0 002	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS (PISCINA SEMIOLIMPICA - DISTRITO 1)	1				100,00%	100,00%		37.865,00	37.865,00	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	22 0 002	"MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS (MURO PERIMETRAL TANQUE DE GAS - PISCINA SEMIOLIMPICA D-1)"	1				100,00%	100,00%		49.999,09	49.999,09	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	30 0 002	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS (REVOQUE EXTERIOR NICHOS - REVOQUE INTERIOR OFICINAS)	1				100,00%	100,00%		22.532,80	22.532,80	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
D2	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. JOSE VIA GARCIA)	1				100,00%	100,00%		49.961,13	49.961,13	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. SANTA TERESITA DEL NIÑO DE JESUS)	1				100,00%	100,00%		49.991,12	49.991,12	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. QUINTANILLA B)	1				100,00%	100,00%		49.999,81	49.999,81	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. SAN ANTONIO DE PADUA)	1				100,00%	100,00%		48.986,88	48.986,88	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ARCO IRIS)	1				100,00%	100,00%		49.968,64	49.968,64	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ. CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO	ECONOM.					
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. QUINTANILLA A)		1			100,00%	100,00%		34.996,53	34.996,53	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. QUINTANILLA "C")		1			100,00%	100,00%		49.959,19	49.959,19	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. JESUS TERCEROS SILES, U.E. MIRIAM MAGDA TERCEROS)		1			100,00%	100,00%		49.573,65	49.573,65	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. JUAN PABLO II)		1			100,00%	100,00%		49.916,01	49.916,01	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. COPACABANA)		1			100,00%	100,00%		49.220,50	49.220,50	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. PUNTTI CHICO)		1			100,00%	100,00%		49.905,98	49.905,98	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. VILLA ANIMAS)		1			100,00%	100,00%		49.996,95	49.996,95	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	20 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. COPACABANA SECTOR LABORATORIO)		1			100,00%	100,00%		14.374,49	14.374,49	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
D3	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. PACATA)		1			100,00%	100,00%		26.992,69	26.992,69	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ)		1			100,00%	100,00%		29.979,53	29.979,53	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. EDUCACIÓN Y LIBERACIÓN 10 DE DICIEMBRE)		1			100,00%	100,00%		29.198,50	29.198,50	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGRAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO					
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (REJILLAS PARA DESAGÜE PLUVIAL U.E. EDUCACIÓN Y LIBERACIÓN 10 DE DICIEMBRE)	1				100,00%	100,00%		11.446,75	11.446,75	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
D4	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. CARLOS PEREDO)	1				100,00%	100,00%		49.978,97	49.978,97	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. HERNAN RIVERA FIORILO, U.E. NACIONAL CALAMA)	1				100,00%	100,00%		44.997,81	44.997,81	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. SAN JACINTO)	1				100,00%	100,00%		49.997,35	49.997,35	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ENTRE RIOS)	1				100,00%	100,00%		39.899,81	39.899,81	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. GUADALUPE)	1				100,00%	100,00%		49.999,60	49.999,60	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. INCA RANCHO)	1				100,00%	100,00%		49.991,33	49.991,33	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. MARISCAL SUCRE)	1				100,00%	100,00%		47.092,02	47.092,02	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (MTTO. DE CUBIERTA-MTTO. TANQUE BAJO-MTTO. SECTOR. JUEGOS DE LA U.E. SAN JACINTO)	1				100,00%	100,00%		38.032,73	38.032,73	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DESMONTE DE TINGLADO ANTIGÜO U.E. CARLOS PEREDO)	1				100,00%	100,00%		17.670,00	15.590,00	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (MTTO. DE CUBIERTA-REPOSICIÓN DE CIELO FALSO U.E. GUADALUPE) (MTTO. DE CUBIERTA DE U.E. MARISCAL SUCRE)"	1				100,00%	100,00%		49.889,57	49.889,57	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. SIMON BOLIVAR)	1				100,00%	100,00%		21.013,26	21.013,26	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
	21 0 003	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROTECTORES METALICOS U.E. CARLOS PEREDO)"	1				100,00%	100,00%		12.613,28	12.613,28	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



D6	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. REPUBLICA DEL ECUADOR)	1			100,00%	100,00%		31.992,33	31.992,33	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ISRAELI EL ABRA)	1			100,00%	100,00%		17.495,91	17.495,91	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
D7	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ANTOFAGASTA)	1			100,00%	100,00%		26.256,55	26.256,55	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. GUALBERTO VILLARROEL)	1			100,00%	100,00%		28.999,43	28.999,43	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ULINCATE)	1			100,00%	100,00%		38.995,06	38.995,06	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ELIZARDO PEREZ, U.E. VILLA CLOTILDE)	1			100,00%	100,00%		39.986,53	39.986,53	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. CURUBAMBA, U.E. SAN LUIS)	1			100,00%	100,00%		42.809,63	42.809,63	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. BOLIVIANO BRITANICO)	1			100,00%	100,00%		45.983,72	45.983,72	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	12 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MICRO RIEGO (MANT. EMBOVEDADO DE RIEGO CALLE COLOMBIA)	1			100,00%	100,00%		30.424,97	30.424,97	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	20-0000-030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD(C.S. HUAYLLANI)	1			100,00%	100,00%		33.874,94	33.874,94	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
	21 1312008240 0000	MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CARLOS PEREDO DISTRITO 4 (CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA CANCHA MÚLTIPLE)	1			100,00%	100,00%		171.827,81	171.827,81	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES	
									TOTALES:	0,00	25.305.137,81	22.792.948,90

5 PROYECTOS PARALIZADOS												
	22 0003 000	MEJ. CAMPOS DEPORTIVOS SACABA (CANCHA MULTIPLE OTB KAMI)				50,00%	0,00%		99.991,13		PROYECTO EN RESOLUCION DE CONTRATO	
	11 0001 00	CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCARA (LLAVE EN MANO)				38,00%	34,69%		18.515.877,96	6.423.837,38	PROYECTO EN RESOLUCION DE CONTRATO	
									TOTAL:	0,00	18.615.869,09	6.423.837,38

2 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES												
	31 1312002670 0000 000	*CONST. GAVIONES PARA TORRENTERAS SACABA (HUAYLLANI SUD CHULLPAMOQO TRAMO 1)							35.092,01		NO LLEGO A SMIS	
	31 1312002670 0000 000	*CONST. GAVIONES PARA TORRENTERAS SACABA (D-4 HUAYLLANI SUD TRAMO 2 Y TRAMO 3)							62.692,12		NO LLEGO A SMIS	
									TOTALES:		81.368.977,29	46.381.332,85



N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES		
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO						ECONOM.	
5 PROYECTOS EN EJECUCIÓN														
127	21 1312008370 0000 000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA LITORAL BOLIVIANO "A" NIVEL SECUNDARIO DISTRITO - LAVA LAVA	1				53,00%	20,00%	4.617.763,97	4.617.763,97	923.552,79	Ing. Daniel Flores	PROYECTO EN EJECUCION. BOLIVIA CAMBIA	
126	22 1312008380 0000 000	CONST. CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIAS COMUNIDAD UCUCHI - DISTRITO UCUCHI	1				48,00%	20,00%	4.213.299,14	4.213.299,14	842.659,82	Ing. Gregorio Montecinos	PROYECTO EN EJECUCION. BOLIVIA CAMBIA	
130	17 1312006160 0000 000	CONST. PAVIMENTO FLEXIBLE RELLENO SANITARIO (CORDONES, CUNETAS Y BOCA TORMENTAS)	1				35,00%	31,39%	487.804,48	396.691,72	124.531,67	Ing. Daniel Flores	PROYECTO EN EJECUCION.	
135,1	10000100	CONST. CENTRO DE PRODUCCION DE SEMILLA Y BIO INSUMOS PARA LAS COMUNIDADES PRODUCTIVAS DE SACABA (OBRAS DE APOYO PRODUCTIVO)	1				75,00%	24,01%	2.499.960,44	2.499.960,44	600.215,32	Ing. Carlos Peña	PROYECTO EN EJECUCION.	
178	20 0 045	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (C.S. SAPANANI MANT. INST. ELECTRICA, CONSULTORIOS, PUERTA EXTERIOR, ESTRUCTURA Hªª TANQUE ALTO)	1				3,00%		65.090,00	65.090,00	0,00	N/A	PROYECTO EN EJECUCION.	
									TOTALES:	11.883.918,03	11.792.805,27	2.490.959,60		
34 PROYECTOS CONCLUIDOS														
129	21 1312008360	CONST. UNIDAD EDUCATIVA 27 DE MAYO NIVEL PRIMARIO - DISTRITO LAVA LAVA	1				100,00%	20,00%	1.660.061,17	1.660.061,17	332.012,10	Arq. Daniela Revollo	PROYECTO EJECUTADO. BOLIVIA CAMBIA. ELAB DE PLANILLA	
132	12 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO (QUINSA MAYU MALDONADO)	1				100,00%	100,00%	40.524,51	40.524,51	40.524,51	N/A	PROYECTO EJECUTADO.	
135	10000100	CONST. CENTRO DE PRODUCCION DE SEMILLA Y BIO INSUMOS PARA LAS COMUNIDADES PRODUCTIVAS DE SACABA (OBRAS CIVILES)	1				100,00%	100,00%	1.538.996,79	1.538.996,79	1.538.996,79	Ing. Carlos Peña	PROYECTO EJECUTADO. MONTO CONTRATO: 2.638.299,96 Bs.	
137	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. 22 DE ENERO, U.E. GRAL. ISMAEL MONTES, U.E. JUAN JOSE TORREZ G.)	1				100,00%	100,00%	39.940,31	39.940,31	39.940,31	N/A	PROYECTO EJECUTADO.	
138	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. CHURO, U.E. PALCA CHICO, U.E. PISLY, U.E. MOLINOS.)	1				100,00%	100,00%	49.902,44	49.902,44	49.902,44	N/A	PROYECTO EJECUTADO.	
139	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. Rene fernandez Becerra)	1				100,00%	100,00%	35.000,00	34.944,09	34.944,09	N/A	PROYECTO EJECUTADO.	
140	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. Nucleo Laraty)	1				100,00%	100,00%	49.946,47	49.946,47	49.946,47	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.	
142	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. TORCUATO PEREDO, U.E. MOLINO BLANCO)	1				100,00%	100,00%	29.000,00	28.698,82	28.698,82	N/A	PROYECTO CONCLUIDO	
144	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. 27 DE MAYO, U.E. NUEVO AMANECER)	1				100,00%	100,00%	50.000,00	22.939,20	22.939,20	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.	
145	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. 27 DE AGOSTO)	1				100,00%	100,00%	34.000,00	33.957,32	33.957,32	N/A	PROYECTO CONCLUIDO	
146	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. LAVA LAVA)	1				100,00%	100,00%	35.637,61	34.325,19	34.325,19	N/A	PROYECTO CONCLUIDO	



N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES	
			EJ.	CONC.	P. EJ.	PAR.	FISICO						ECONOM.
147	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E.23 DE MARZO, U.E. 1RO DE MAYO, U.E. 25 DE MAYO, U.E. DIONISIO SOLIZ LOPEZ)	1				100,00%	100,00%	35.676,82	35.676,82	35.676,82	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
148	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. KEWIÑAL CHICO)	1				100,00%	100,00%	48.212,72	48.212,72	48.212,72	N/A	PROYECTO CONCLUIDO
149	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. ICHOGOLLU ALTO)	1				100,00%	100,00%	26.000,00	26.000,00	26.000,00	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
150	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. RENE BARRIENTOS ORTUÑO, U.E. RODEO, U.E. TUTMAYU)	1				100,00%	100,00%	44.999,97	44.999,97	44.999,97	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
151	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. CHALLVIRI - U.E. PALCA GRANDE)	1				100,00%	100,00%	44.829,00	44.829,00	44.829,00	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
152	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. PAMPILLA)	1				100,00%	100,00%	46.820,11	46.820,11	46.820,11	N/A	PROYECTO EJECUTADO.
154	120011000	MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO ARAP SACABA (CONSTRUCCION DE CANAL TRAMO A MOLLOCOTA Y TRAMO B TUSCAPUJO CENTRO)	1				100,00%	100,00%	34.986,37	32.146,92	7.645,65	Arq. Daniela Revollo	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES.
155	210000003	MANT. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. TUTIMAYU - PINTURA EXTERIOR)	1				100,00%	100,00%	23.527,98	23.527,98	23.527,98	N/A	PROYECTO EJECUTADO.
161	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. KALUYO CHICO)	1				100,00%	100,00%	13.727,00	13.727,00	13.727,00	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
164	21 0 003	MANT. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. NUEVO AMANECER - SECTOR TALLER MECÁNICO)	1				100,00%	100,00%	19.967,13	19.967,13	19.967,13	N/A	PROYECTO EJECUTADO
165	12 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MICRO RIEGO (MANT. CANAL DE RIEGO ARAP)	1				100,00%	100,00%	42.202,48	42.202,48	42.202,48	N/A	PROYECTO EJECUTADO
166	21 0 003	MANT. Y MEJ. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. 2 DE AGOSTO)	1				100,00%	100,00%	48.114,65	48.114,65	48.114,65	N/A	PROYECTO CONCLUIDO.
167	200000030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (C.S. AGUIRRE)	1				100,00%	100,00%	49.950,49	49.950,49	49.950,49	N/A	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
168	200000030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (C.S. MELGA)	1				100,00%	100,00%	30.885,55	30.885,55	30.885,55	N/A	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES.
169	200000030	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (C.S. LARATI)	1				100,00%	100,00%	16.540,82	16.540,82	16.540,82	N/A	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES



N°	APERTURA PROGAMA- TICA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO			% DE AVANCE		MONTO PRESUPUES- TADO	MONTO CONTRATO	MONTO CANCELADO	SUPERVISOR OBRA	OBSERVACIONES
			EJ.	CONC.	P.EJ.	PAR.	FISICO					
170	20 1312008130 0000 000	CONST. TANQUES DE AGUA PARA CENTROS DE SALUD SACABA (C.S. AGUIRRE, C.S. AGUIRRE 2, C.S. GUADALUPE Y C.S. CATACHILLA)	1			100,00%	95,36%	174.982,36	174.982,36	166.863,54	Ing. Nancy Hinojosa	PROYECTO EJECUTADO. GLOBALES
171	20 1312008130 0000 000	CONST. TANQUES DE AGUA PARA CENTROS DE SALUD SACABA (C.S. LARATY, C.S. SAPANANI, C.S. MELGA)	1			100,00%	100,00%	91.971,99	91.971,99	91.971,99	Ing. Gregorio Montecinos	PROYECTO EJECUTADO.
172	12 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE MICRO RIEGO (DISTRITO 5 REFACCION TANQUE DE AGUA LLACHOJ MAYU)	1			100,00%	100,00%	73.585,00	73.585,00	0,00	Ing. Carlos Peña	PROYECTO EJECUTADO. ELAB. DE PLANILLA
174	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. INTI MUJU)	1			100,00%	100,00%	19.781,32	19.781,32	19.781,32	N/A	PROYECTO EJECUTADO.
175	21 0 003	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (U.E. NUCLEO LARATY, REPOSICION DE CUBIERTA, CANALETAS Y REVOQUES)	1			100,00%	100,00%	12.542,57	12.542,57	12.542,57	N/A	PROYECTO EJECUTADO.
176	12 0 001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE MICRO RIEGO (MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PISLY - PALCA DISTRITO RURAL PALCA)	1			100,00%		40.994,38	40.994,38	0,00	N/A	PROYECTO EJECUTADO. ELAB. DE PLANILLA
								TOTALES:	4.503.308,01	4.471.695,57	2.996.447,03	
0 PROYECTOS POR EJECUTAR EN PLANIFICACIÓN - CONTRATACIONES												
								TOTAL:	0,00			
								TOTALES:	16.387.226,04	16.264.500,84	5.487.406,63	



"CONSTRUCCION INSTITUTO BERTO NICOLI DISTRITO 1"



- * Costo de la Obra: 6.781.419,94 Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



"CONST. UNIDAD EDUCATIVA TECNICO HUMANISTICO BICENTENARIO DISTRITO 2"



- * Costo de la Obra: 12.435.843,03Bs
- * Avance físico: 100%
- * Estado del proyecto: **EJECUTADO**



CONST. UNIDAD EDUCATIVA 27 DE MAYO NIVEL PRIMARIO - DISTRITO LAVA LAVA

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA



- * Costo de la Obra: 1.660.061,17 Bs
- * Avance físico: 100.00%
- * Estado del proyecto : **EJECUTADO**



CONST. REDES PRIMARIAS DE AGUA POTABLE DISTRITOS URBANOS SACABA SUBSISTEMA OESTE



Costo de la Obra 26.097.504,24 Bs
*Avance físico: 40,00%
*Estado del proyecto: **EN EJECUCIÓN**





"CONST. UNIDAD EDUCATIVA DOMITILA BARRIOS CUENCA NIVEL SECUNDARIO-DISTRITO 4"



- * Costo de la Obra: 5.999.849,42 Bs
- * Avance físico: 40%
- * Estado del proyecto: **EN EJECUCION**



CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MAX FERNANDEZ ROJAS - NIVEL PRIMARIO DISTRITO 2



- * Costo de la Obra: 3'619.237,20 Bs
- * Avance físico: 80%
- * Estado del proyecto: **EN EJECUCIÓN**



CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA LITORAL BOLIVIANO "A" NIVEL SECUNDARIO- DISTRITO LAVA LAVA

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA



- * Costo de la Obra: 4.617.763,97 Bs
- * Avance físico: 53.00%
- * Estado del proyecto : **EN EJECUCION**



CONST. CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIAS COMUNIDAD UCUCHI - DISTRITO UCUCHI

PROGRAMA BOLIVIA CAMBIA



- * Costo de la Obra: 4.213.299,14 Bs
- * Avance físico: 48 %
- * Estado del proyecto: **EN EJECUCION**



**GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA**

Una Ciudad con Valor

PROYECTOS Y PREINVERSIÓN



SECTOR : UNIDAD: PROYECTOS Y PREINVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL La unidad de proyectos y pre inversión tiene como objetivo elaborar, planificar, administrar y diseñar en coordinación con las unidades ejecutoras involucradas y la población a través de sus representantes, proyectos de inversión por año de gestión según las necesidades del Municipio brindando asistencia técnica en materia de diseño en infraestructura social, vial y productiva, con la disposición de software, levantamientos topográficos y asistencia técnica especializada de acuerdo al tipo de proyecto de corto y mediano plazo en beneficio de la población mediante procesos participativos, oportunos en el marco de la ley 777 en sus tres subsistemas, para obtener una gestión de resultados.

NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO				PRODUCTO LOGRADO				PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	126 CARPETAS, 52 CARPETAS DE PROYECTO Y 74 CARPETAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				269 CARPETAS ELABORADAS, 147 CARPETAS DE PROYECTO Y 122 CARPETAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
									100%		
DISTRITAL	DIST.	(PROY)	(SERV.)	(Σ)	(PROY)	(SERV.)	(Σ)	(%)	% EJECUCION FISICA POR DISTRITO	126 CARPETAS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Se ha logrado elaborar 269 CARPETAS, 147 CARPETAS DE PROYECTO Y 122 CARPETAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
	D1	0	10	10	8	23	31	310%			
	D2	0	14	14	7	16	23	164%			
	D3	0	3	3	6	5	11	367%			
	D4	0	9	9	5	13	18	200%			
	D5	10	2	12	16	4	20	167%			
	D6	0	2	2	5	3	8	400%			
	D7	0	7	7	3	9	12	171%			
	DA	3	1	4	4	1	5	125%			
	DCH	13	1	14	19	5	24	171%			
	DLL	6	4	10	19	6	25	250%			
	DP	4	3	7	9	7	16	229%			
	DU	8	2	10	14	3	17	170%			
	MCPL	8	16	24	32	27	59	246%			



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION		RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA		ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> 29 Sistemas de micro riego en el área rural de Sacaba. 	26 carpetas elaboradas y 30 carpetas adicionales	100%			
DISTRITAL	<p>Cantidad de infraestructuras en micro riego.</p> <ul style="list-style-type: none"> D5 – Se ejecutaran 10 sistemas de riego. DA – Se ejecutaran 2 sistemas de riego. DCH – Se ejecutaran 12 sistemas de riego. DP – Se ejecutaran dos proyectos, un centro de acopio de abono y un sistema de riego en palca grande. DU – Se ejecutaran 3 sistemas de riego. 	<p>Se ha elaborado las siguientes carpetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> D5 – 14 carpetas elaboradas DA – 1 carpeta elaborada DCH – 21 carpetas elaboradas DP – 5 carpetas elaboradas DU – 7 carpetas elaboradas MUNICIPAL – 5 carpetas elaboradas <p>Se incluyo a los siguientes distritos:</p> <ul style="list-style-type: none"> D2 – 1 carpeta elaborada D7 – 2 carpetas elaboradas 			Implementación de 29 sistemas de micro riego en el área rural de Sacaba.	56 carpetas elaboradas para la ejecucion y mantenimiento de sistemas de riego.



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	3 Infraestructuras de salud en proceso y la construcción de tanques para centros de salud en el municipio de Sacaba.	3 Infraestructuras de salud en proceso y la construcción de tanques para centros de salud en el municipio de Sacaba.	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			100%		
DISTRITAL	Cantidad de infraestructuras de salud. <ul style="list-style-type: none"> • DP - Const. establecimiento de salud Bateón 8 de junio del distrito palca. • D4 - Const. centro rehabilitación para personas con discapacidad sacaba (instalaciones especiales) • DU - Const. centro de salud distrito rural Ucuchi (instalaciones especiales y obra fina) • Const. tanques de agua para centros de salud sacaba (C.S. Aguirre, C.S. Aguirre 2, C.S. Guadalupe, C.S. Catachilla, C.S. Melga, C.S. Sapanani y C.S. Laraty) 	Se ha elaborado 3 carpetas en infraestructuras de salud: <ul style="list-style-type: none"> • DP - Const. establecimiento de salud Bateón 8 de junio del distrito palca. • D4 - Const. centro rehabilitación para personas con discapacidad sacaba (instalaciones especiales) • DU - Const. centro de salud distrito rural Ucuchi (instalaciones especiales y obra fina) Elaboración de 2 carpetas para la ejecución de tanques para almacenamiento de agua. <ul style="list-style-type: none"> • Const. tanques de agua para centros de salud sacaba (C.S. Aguirre, C.S. Aguirre 2, C.S. Guadalupe, C.S. Catachilla, C.S. Melga, C.S. Sapanani y C.S. Laraty) 		3 Establecimientos de salud mejoradas, y 7 centros de salud mejorados con tanques de almacenamiento de agua.	* Se ha elaborado la carpeta para la contratación y la ejecución del Establecimiento de Salud Bateón 8 de Junio * Se ha elaborado la carpeta para la contratación y la conclusión del Centro de Rehabilitación para Personas con Capacidades Diferentes. * Se ha elaborado la carpeta para la contratación y la ejecución del Centro de Salud Ucuchi. * Se ha elaborado la carpeta para la contratación y ejecución de los tanques de agua para (C.S. Aguirre, C.S. Aguirre 2, C.S. Guadalupe, C.S. Catachilla, C.S. Melga, C.S. Sapanani y C.S. Laraty)



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	GESTION DE 6 PROYECTOS EN SALUD	6 CENTROS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			100%		
DISTRITAL	<p>Cantidad de infraestructuras de salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GBL - Const. Hospital México de Segundo nivel ampliado (HEMODIALISIS) • Const. de centro de salud integral Guadalupe • Const. de centro de salud integral Aguirre • Const. de centro de salud integral Huayllani • Construcción de centro de salud integral Alalay • Mejoramiento del centro de salud Catachilla 	<p>Se ha logrado incorporar en el plan de Salud Municipa los siguientes centros hospitalarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GBL - Const. Hospital México de Segundo nivel ampliado (HEMODIALISIS) • Const. de centro de salud integral Guadalupe • Const. de centro de salud integral Aguirre • Const. de centro de salud integral Huayllani • Construcción de centro de salud integral Alalay • Mejoramiento del centro de salud Catachilla 		<p>Gestión de proyectos de 1 Hospital de Segundo Nivel, 4 centros de salud integral y el mejoramiento de un centro de salud.</p>	<p>6 centros hospitalarios incluidos en el Plan Municipal de Salud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GBL - Const. Hospital México de Segundo nivel ampliado (HEMODIALISIS) • Const. de centro de salud integral Guadalupe • Const. de centro de salud integral Aguirre • Const. de centro de salud integral Huayllani • Construcción de centro de salud integral Alalay • Mejoramiento del centro de salud Catachilla



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	PRODUCTO LOGRADO	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	Ampliación de 2 unidades educativas en el área rural y coadyuvar a la unidad de educación con la elaboración de carpetas en servicios de mantenimiento.	2 carpetas elaboradas programadas inicialmente, 22 carpetas adicionales y 47 carpetas elaboradas en coordinación con la Dir. Desarrollo Humano	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			100%		
DISTRITAL	Cantidad de infraestructuras en Educación <ul style="list-style-type: none"> • DP – Se ejecutara la ampliación de 3 aulas en la Unidad Educativa Mayca Mayu. • DU – Se ejecutara la tercera planta en la Unidad Educativa Tutimayu. 	Los productos logrado son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • DP - 1 Carpeta concluida • DU – 1 Carpeta concluida Adicionales: <ul style="list-style-type: none"> • D1 – 4 Carpetas adicionales • D2 – 4 Carpetas adicionales • D3 - 1 Carpeta adicional • D4 – 1 Carpeta adicional • D6 – 2 Carpetas adicionales • D7- 1 Carpeta adicional • DLL – 6 Carpetas adicionales • DP – 1 Carpeta adicional • DU – 1 Carpeta Adicional • DA – 1 Carpeta adicional 		2 Establecimientos Educativos mejorados, y la intervención de 89 Establecimientos Educativos con servicios de mantenimiento.	



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	Producto Logrado	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	Gestión de 7 proyectos en educación	4 proyectos financiados por UPRE	57%		
DISTRITAL	Cantidad de infraestructuras de Educacion <ul style="list-style-type: none"> D2 - Const. Aulas , Laboratorios Y Administración (Secundaria) D2 - Const. De Aulas, Baños U.E. Max Fernández (Primaria) D4 - Const. Aulas Y Dirección Administrativa U.E. Guadalupe (Secundaria) DLL - Const. Proyecto A Diseño Final De 9 Aulas Mas Administración (Primaria) DLL - Const. Proyecto A Diseño Final De 12 Aulas (Primaria) DLL - Const. Técnico Humanístico Nuevo Amanecer Korihuma 2 (Secundaria) DLL - Const. Técnico Humanístico 23 De Marzo Alalay (Secundaria) 	Se ha logrado la gestión de financiamiento de los siguientes proyectos: <ul style="list-style-type: none"> D2 - Const. De Aulas, Baños U.E. Max Fernández (Primaria) D4 - Const. Aulas Y Dirección Administrativa U.E. Domitila Barrios (Secundaria) DLL - Const. Proyecto A Diseño Final De 6 Aulas U.E. 27 de Mayo (Primaria) DLL - Const. Técnico Humanístico Litoral Boliviano "A" zona Alalay (Secundaria) 		Elaboración de 3 proyectos en infraestructura Educativa para Primaria y 4 proyectos en Secundaria	Elaboración de 2 proyectos a Diseño Final en infraestructura Educativa para Primaria y 2 proyectos a diseño final en Secundaria El monto de financiamiento es de : 15.896.911,76 Bs. (Quince millones ochocientos noventa y seis mil novecientos once 76/100 Bolivianos) En el área de Educación.



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	Producto Logrado	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
			% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
MUNICIPAL	Implementación de 4 sistemas en saneamiento básico.	Implementación de 3 sistemas en saneamiento básico.	75%		
DISTRITAL	<ul style="list-style-type: none"> MUNICIPAL – Se ejecutaran las redes primarias de acuerdo a proyecto y gestión de financiamiento correspondiente a los distritos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y LAVA LAVA DU – Se ejecutaran 2 sistemas en saneamiento básico y la perforación de un pozo. 	<ul style="list-style-type: none"> MUNICIPAL – Se ejecutaran las redes primarias de acuerdo a proyecto y gestión de financiamiento correspondiente a los distritos 2, 3, y 6 DU – Se ejecutaran 2 sistemas en saneamiento básico y la perforación de un pozo. 		Implementación de 1 sistema de agua potable a nivel macro integral y 3 sistemas de saneamiento básico en ucuchi.	<ul style="list-style-type: none"> * Se ha elaborado la carpeta para la contratación y ejecución de las redes primarias en los Distrito 2, 3 y 6. * Se ha elaborado la carpeta para la contratación de la Pre Inversión de Saneamiento Básico Ucuchi – Melga * Se ha elaborado la carpeta para la contratación y ejecución de la Perforación de Pozo en La Quiña.



NIVEL	PRODUCTO PROGRAMADO	Producto Logrado	PORCENTAJE ALCANZADO DE EJECUCION	RESULTADO	
MUNICIPAL	Implementación de 4 proyectos en el sector de Urbanismo y Vivienda.	Implementación de 2 proyectos en el sector de Urbanismo y Vivienda. Se ha logrado entregar las preinversiones de los distribuidores de Servicio de Caminos y Quintanilla a la ABC para su revisión.	% EJECUCION FISICA	ESPERADO	ALCANZADO
			100%		
DISTRITAL	Cantidad de infraestructuras de salud. <ul style="list-style-type: none"> MUNICIPAL – Se ejecutara el pavimento flexible al relleno sanitario. MUNICIPAL – Se gestionara el financiamiento del Distribuidor Vehicular del Servicio de Caminos. MUNICIPAL – Se gestionara el financiamiento del Distribuidor Vehicular de Quintanilla. DCH – Se concluirá la Guardería de Catachilla Alta. 	Cantidad de infraestructuras de salud. <ul style="list-style-type: none"> MUNICIPAL – Se ejecutara el pavimento flexible al relleno sanitario. DCH – Se ha elaborado una carpeta para la guardería Catachilla alta. Se ha logrado entregar las preinversiones de los distribuidores de Servicio de Caminos y Quintanilla a la ABC para su revisión. 		Implementación de 4 proyectos en el sector de Urbanismo y Vivienda.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha elaborado la carpeta para la compra de materiales de construcción para ejecutar el Pavimento Flexible al Relleno Sanitario. Se ha elaborado una carpeta para la guardería Catachilla alta. Entrega de las preinversiones de los distribuidores de Servicio de Caminos y Quintanilla a la ABC para su revisión.



SECTOR :DEPORTES		UNIDAD: PROYECTOS Y PREINVERSION
NIVEL	PRODUCTOS PROGRAMADOS	RESULTADO ALCANZADO
MUNICIPAL	<ul style="list-style-type: none"> GESTION DE 1 PROYECTO EN EL AREA DE DEPORTES. 	Elaboración de 1 proyecto a Diseño Final en el sector DEPORTES.
DISTRITAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CONST. CANCHA DE FUTBOL Y GRADERÍAS COMUNIDAD UCUCHI - DISTRITO UCUCHI <p>Monto: 4.213.299,14 Bs.</p>	

Monto financiado en educación y deportes por UPRE	Bs. 20.110.210,90	Veinte millones ciento diez mil doscientos diez 90/100 Bolivianos
--	--------------------------	--
